

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 008-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

AL : ING. EULER BECERRA AREVALO

Asistente Técnico de Gestión y Monitoreo – GIP-MPJ

DEL : ING. HENRY HURTADO COLLANTES

REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.

ASUNTO : ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE LA FASE III – PERIODO JUNIO 2021.

REFERENCIA : a) CARTA N°008-2021/CVLH-RL

FECHA : Jaén, 22 de julio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el levantamiento de las observaciones al INFORME MENSUAL DE LA FASE III – PERIODO JUNIO 2021, DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA.", suscrito por el contratista a cargo del servicio en mención.

Atentamente.

CONSORCIO CC

Henry Hurtado Collantes
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CC



RECIBIDO: 22/07/2021

11:00 AM



Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

FECHA: 21/07/2021

CARTA N°008-2021/CVLH-RL

SEÑOR: CONSORCIO CC (ING. HENRY HURTADO COLLANTES-RC)

ASUNTO: REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 004- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA- CHONTALI


REFERENCIA: CARTA N° 007-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC.

De mi especial consideración,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERÚ E.I.R.L Y CORPORACIÓN AVIR S.A.C. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se está remitiendo (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 004- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021) suscrito y alcanzado por el Ing. Residente DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA – CHONTALI. Para su respectiva evaluación y aprobación.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CC


Henry Hurtado Collantes
REPRESENTANTE COMÚN
RECIBI 20/07/2021
04:00 pm.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

**CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. Y
CORPORACION AVIR S.A.C.**

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005, CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES, IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC N° 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006, BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:



PRIMERO. OBJETO=====

LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005, Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC N° 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CAJAMARCA.

SEGUNDO.- DENOMINACION Y DURACION =====

EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRÁ COMO DENOMINACION CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARÁ SUS ACTIVIDADES DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CULMINARÁ CON LA LIQUIDACION DEL SERVICIO.

TERCERO.- FINALIDAD =====

EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CAJAMARCA.

CUARTO.- DOMICILIO LEGAL Y FISCAL =====

POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CORREO ELECTRÓNICO: reycieza@gmail.com.

QUINTO.- REPRESENTACIÓN LEGAL Y FUNCIONES =====

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA EJERCIDA POR EL SEÑOR: **REYLE CIEZA TORRES** IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729, QUIEN EJERCERÁ TODAS LAS FACULTADES Y CONTARÁ CON LOS PODERES SUFICIENTES PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, ASÍ COMO EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.



EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:


1. QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL SERVICIO, ASI COMO ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
2. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y PROCESAL EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADO, COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
3. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACIÓN EN PROCESOS CONCILIADORES Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIÉNDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR ÁRBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR APELACIONES Y PROCESOS DE REVISIÓN Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.
4. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMÁS DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA.
5. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICÍA NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCIÓN DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACIÓN.

SEXTO. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION=====

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA, SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN ACTUARÁ COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRÁ LAS FACTURAS QUE CORRESPONDAN A "LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN; Y ESTA A SU VEZ EMITIRÁ LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE INTED PERU E.I.R.L.

SEPTIMO. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION=====

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:



[Handwritten signature]



Obligaciones de INTED PERU E.I.R.L.:

60%

- EJECUCIÓN DEL SERVICIO
- ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS
- LA OBLIGACIÓN DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPIRAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE INTED PERU E.I.R.L.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S.A.C.:

40%

- EJECUCIÓN DEL SERVICIO
- ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL:

100%


OCTAVO. - CONTRIBUCIONES, GASTOS, APORTES, OBLIGACIONES Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO =====

- 8.1. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO SERÁ DETERMINADA CON CARÁCTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.
- 8.2. LA OBTENCION DE LA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDO POR INTED PERU E.I.R.L.
- 8.3. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU E.I.R.L.
- 8.4. LAS UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU E.I.R.L.
- 8.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A LA ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL SERVICIO, SERA RESPONSABILIDAD DE INTED PERU E.I.R.L.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE INTED PERU E.I.R.L. Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C.

CHACHAPOYAS, 17 de AGOSTO del 2020



 REYLE CIEZA TORRES
 DNI N° 43419729
 Titular Gerente de
 INTED PERU E.I.R.L.


 RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO
 DNI N° 42198006
 Gerente General de
 CORPORACION AVIR S.A.C.


NOTARÍA MORI
 ESTE DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN NOTARIAL AL REVERSO

000137



CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaría; y la legalización de firmas se efectúa de conformidad con el artículo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. **CERTIFICO:** Que las firmas que anteceden corresponden a: **REYLE CIEZA TORRES**, identificado con DNI N° 43419729 quien manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EIRL, con facultades inscritas en la Partida N° 11025027 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chachapoyas y a: **RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO**, identificado con DNI N° 42198006 quien manifiesta ser el Gerente General de Corporación Avir S.A.C, con facultades inscritas en la Partida N° 11020454 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus actos públicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. — Chachapoyas, 17 de agosto del 2020. =====

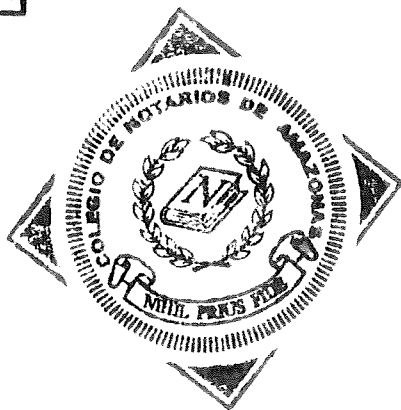


LUIS FELIPE MORI TUESTA
ABOGADO
NOTARIO DE CHACHAPOYAS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 007-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

AL : CONSORCIO VIAL LA HUACA
ATENCION : Ing. Reyle Cieza Torres – Representante Legal
DEL : ING. HENRY HURTADO COLLANTES
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO : ALCANZO OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE LA FASE III – PERIODO JUNIO 2021.
REFERENCIA : a) CARTA N° 030-2021-ING.EBA
FECHA : Jaén, 20 de julio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar las observaciones al INFORME MENSUAL DE LA FASE III – PERIODO JUNIO 2021, DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA.", suscrito por el Ing. Monitor del servicio por parte de la entidad. Por lo cual pido a su representado levantar dichas observaciones dentro del plazo establecido conforme a ley.

Atentamente.

CONSORCIO CC

Henry Hurtado Collantes
Henry Hurtado Collantes
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CC

Recibí
20 de julio 2021
hora : 3:00 PM



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

"GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 030-2021-ING. EBA

AL : ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Común del CONSORCIO CC

DEL : ING. EULER BECERRA ARÉVALO
Asistente Técnico de Gestión y Monitoreo – GIP - MPJ

ASUNTO : OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE LA FASE III – PERIODO JUNIO 2021.

REFERENCIA : a) CARTA N° 006-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

FECHA : Jaén, 19 de julio 2021

CONSORCIO CC
[Signature]
Henry Hurtado Collantes
REPRESENTANTE COMÚN
Recibí: 19/07/2021
04:00 pm.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentación alcanzada mediante CARTA N° 006-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC, respecto al Informe de Inspección que alcanza el Informe Mensual de Valorización N° 04 correspondiente a junio del 2021 para el SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI"; presentado por el Representante Común del CONSORCIO CC, Sr. Henry Hurtado Collantes en cumplimiento de la Fase III de la ejecución del servicio, por lo que a continuación expongo:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 07/06/2021, mediante CARTA N° 006-2021/CVLH-RL el representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA alcanza el Informe Mensual – Valorización N° 04 (periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021) al inspector del servicio.
- 1.2. Con fecha 07/07/2021, mediante INFORME N° 006-2021-CCC/RKCC/II el ingeniero inspector Ramiro Kobi Coronel Camino alcanza el Informe Mensual - Valorización N° 04 (periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021) al representante común del CONSORCIO CC para derivar dicha documentación a la Entidad contratante.
- 1.3. Con fecha 08/06/2021, mediante CARTA N° 006-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC el representante común del CONSORCIO CC encargada de la inspección del servicio, deriva el Informe de Inspección (periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021) al Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ para la revisión y/o evaluación correspondiente.

II. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-2020):

- 2.1. La información alcanzada contiene documentación física (132 folios – original y copia) y digital (01 CD) en la que se alcanza el Informe Mensual – Valorización N° 04 correspondiente al periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021, tanto del Contratista como de la Inspección.

III. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

A la presente se adjunta un Check List (lista de verificación) del cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 según el Anexo 04, a fin de determinar si la documentación presentada por el





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”

139

Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para el presente periodo, habiendo realizado el Check List correspondiente se ha determinado que la documentación respecto al Anexo N° 04 de los TDR es OBSERVADA.

Se observa la no inclusión dentro del Informe Mensual del CONSORCIO VIAL LA HUACA, el contrato de consorcio, según lo requiere el ítem 9.6 del Anexo 04 de los términos de referencia.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- El Informe Mensual - Valorización N° 04 para el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021 presentada por el Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio, se encuentra OBSERVADA.
- Se recomienda devolver la documentación al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA para subsanar la observación.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinación.

Atentamente,

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Euler Becerra Arévalo
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 143189

CHECK LIST: CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL SEGÚN ANEXO N° 04

(PERIODO: 01/06/2021 AL 30/06/2021)

I. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD					
UNIDAD EJECUTORA (UEI)		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN			
RESPONSABLE DE MONITOREO		ING. EULER BECERRA ARÉVALO (CIP N° 115189)			
REVISIÓN N°		01	FECHA	18/07/2021	
II. INFORMACIÓN DEL TRAMO					
NOMBRE DEL PROYECTO		SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI"			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA					
	LOCALIDADES	CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI			
	PROVINCIA	JAÉN			
	DEPARTAMENTO	CAJAMARCA			
LONGITUD	34.30	ALTURA PROMEDIO	1291 msnm	RUTA	CA-666
III. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO					
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL LA HUACA			
REPRESENTANTE COMÚN		SR. REYLE CIEZA TORRES			
RESIDENTE DEL SERVICIO		ING. JUAN JOSÉ REGALADO INGA (DESDE EL 20/04/2021)			
ASISTENTE DE RESIDENTE		ING. ALAN F. MENDOZA MUÑOZ (CIP N° 175686)			
IV. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DEL SERVICIO					
INSPECTOR DEL SERVICIO		CONSORCIO CC			
REPRESENTANTE COMÚN		SR. HENRY HURTADO COLLANTES			
PROFESIONAL A CARGO DE INSPECCIÓN		ING. RAMIRO K. CORONEL CAMINO (CIP N° 135617)			

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL SEGÚN ANEXO N°04 DE LOS TDR	CHECK LIST	FOLIO	CONSIDERACIONES / OBSERVACIONES
1.- INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
1.1. Nombre del servicio	✓	116	
1.2. N° de Contrato	✓	116	
1.3. Entidad Contratante	✓	116	
1.4. Contratista	✓	116	
1.5. Inspector	✓	116	
1.6. Plazo de ejecución	✓	116	
1.7. Monto de Contrato	✓	116	
1.8. Presupuesto de Mantenimiento Rutinario	✓	116	
2.- REPORTES DE TRABAJO			
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio	✓	114	Estado de transitabilidad: REGULAR
2.2. Acta de constatación de trabajo	✓	112	
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen	✓	110	
3.- PROGRAMACIÓN DE TRABAJO MENSUAL			
3.1. Programación Real Ejecutado	✓	108	Avance real ejecutado al mes (junio): 7.21%
3.2. Programación del Mes	✓	106	Avance programado al mes (junio): 7.21%
3.3. Programación del siguiente Mes	✓	104	Avance programado del siguiente mes (julio): 5.92%
4.- RECURSOS UTILIZADOS			
4.1. Recursos humanos	✓	102	
4.2. Herramientas y materiales	✓	101	
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES			
5.1. Conclusiones	✓	99	
5.2. Recomendaciones	✓	98	
6.- PANEL FOTOGRÁFICO			
Panel fotográfico	✓	88-96	
7.- COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO			
Copias del cuaderno de mantenimiento	✓	72-86	Anotaciones diarias desde el Asiento N° 117 al Asiento N° 167
8.- PUNTOS CRÍTICOS			
Puntos críticos	✓	70	No se encontraron puntos críticos en el periodo
9.- COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO			
9.1. Factura	✓	66	
9.2. Relación de personal; rotativo, socios o trabajador	✓	64	
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI	✓	27-62	
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior	✓	23-25	
9.5. Copia de acta de entrega de terreno	✓	21	
9.6. Copia del contrato y contrato de consorcio en caso corresponda	✓	13-19	SE OBSERVA, la falta del contrato de consorcio
9.7. Copia de seguros del personal y vehículos utilizado para transporte de personal y herramientas	✓	3-10	
9.8. Declaración Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona	✓	1	

OPINIÓN TÉCNICA: DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ESTA CONTIENE LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO N° 4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL D.U. N° 070-2020, SIN OBSERVACIONES RELEVANTES. ADEMÁS, TODAS LAS HOJAS (FOLIOS) HAN SIDO SELLADAS Y FIRMADAS POR EL RESIDENTE DEL SERVICIO Y DICHO INFORME HA SIDO ALCANZADO FORMALMENTE AL INSPECTOR DE LA ENTIDAD POR EL CONTRATISTA.

POR LO ANTES EXPUESTO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LOS TDR (ANEXO N° 04); EL INFORME MENSUAL - JUNIO 2021 SE DECLARA **OBSERVADA**.

REVISADO POR:

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Euler Becerra Arévalo
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 115189

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 006-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	
EXP N°	018592
08 JUL 2021	
HORA	1:50 PM
FOLIOS	132+102
FIRMA	(03 folios)

AL : ING. ARTURO PICHÓN DE LA CRUZ

Gerente de Infraestructura Pública - MPJ

DEL : ING. HENRY HURTADO COLLANTES

REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.

ASUNTO : ALCANZO INFORME MENSUAL – VALORIZACION N°04, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA."

REFERENCIA : a) INFORME N° 006-2021-CCC/RKCC/II

b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM

FECHA : Jaén, 08 de julio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME MENSUAL – VALORIZACION N°04, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia "a", luego de la verificación y evaluación correspondiente de los trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA.

Atentamente.

CONSORCIO CC

Henry Hurtado Collantes
Henry Hurtado Collantes
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CC

JAÉN, 09 DE 07 DEL 2021
VISTO, PASEA: <i>Ing. Euler Bocanegra</i>
PARA: <i>Evaluado e imprimir</i>
<i>(Firma)</i>
Ing. Arturo Pichón de la Cruz GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	
09 JUL 2021	
REG. N°	FIRMA <i>(Firma)</i>
HORA 8:32	FOLIOS 132

INFORME N° 006-2021-CCC/RKCC/II

AL : CONSORCIO CC

ATENCION : ING. HENRY HURTADO COLLANTES

Representante Común.

DEL : ING. RAMIRO KOBİ CORONEL CAMINO

INGENIERO INSPECTOR.

ASUNTO : INFORME MENSUAL – VALORIZACION N°04, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA."

REFERENCIA : CARTA N°007-2021/CVLH-RL

FECHA : Jaén, 07 de julio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME MENSUAL – VALORIZACION N°04, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN – CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:

- 02 files (01 original más 01 copia)
- 01 CD.

Atentamente.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

CONSORCIO CC**CONSORCIO CC**

Henry Hurtado Collantes
REPRESENTANTE COMÚN

I. INFORMACION CONTRACTUAL

a. NOMBRE DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA –
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN –
CAJAMARCA."

b. UBICACIÓN GEOGRAFICA:

LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA –
CHONTALI.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGIÓN : CAJAMARCA.
ZONA : 17
REGIÓN NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO : 1500 M.S.N.M.

c. ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

d. METAS:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL
CARMEN – LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN – JAEN –
CAJAMARCA.

e. CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:

CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

f. RESIDENTE DEL SERVICIO:

ING. JUAN JOSE REGALADO INGA – CIP 123648.

g. CONTRATISTA INSPECTOR:

CONSORCIO CC

h. INSPECTOR:

ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO – CIP 135617

i. SISTEMA DE CONTRATACION:

SUMA ALZADA

j. FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

19 DE MARZO DE 2021

k. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

353 DIAS CALENDARIOS.

l. FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

18 DE MARZO DE 2022.

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:

104 D.C.




Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

- n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°04 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
7.21 %.
- o. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
22.51 %.
- p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

II. REPORTES DE TRABAJO.**2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.**

El contratista – CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

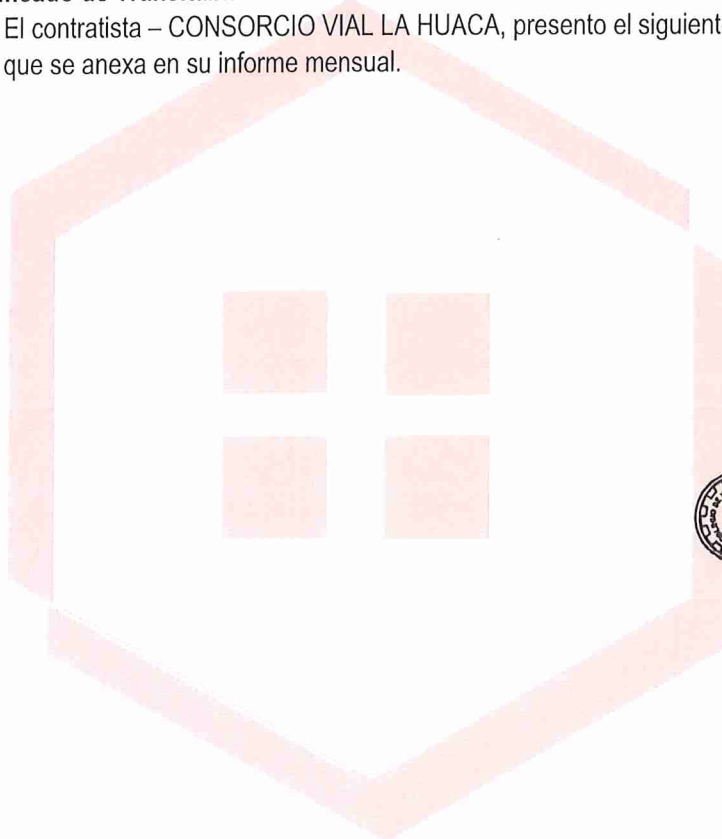

Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

CONSORCIO CC

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Gerente de Infraestructura Publica : Municipalidad Distrital de Jaén

Provincia : Jaén

Departamento : Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa "CONSORCIO VIAL LA HUACA" viene realizando los trabajos de Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de 34.30 km de longitud, según el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 al 30 de junio del 2021 es

Estado de transpirabilidad	Restricciones del camino	Evaluación (marcar con un aspa)
Bueno	Ninguna	(X)
Regular	Algunas	()
Malo	Bastantes	()

Se expide el presente **CERTIFICADO** para los fines consiguientes a los 30 días del mes de junio de 2021

GOBIERNO REGIONAL JAÉN
DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Ing. Aldo P. Vela de la Cruz
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Sello y Firma del Gerente de Infraestructura



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

2.2. Acta de Constatación de Trabajo.

El contratista – CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatación de Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATAACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJA

Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento : km 0+000 km 33+562

Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde del día 30 de Junio del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante legal de consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSÉ REGALADO INGA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBÍ CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la presente acta de constatación de trabajos N°4 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluación y a las penalidades establecidas en el contrato; e valor de la presente acta de VENTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 92/100 (S/ 25,288.92) correspondiente a los trabajos realizados durante los días, comprendidos entre el 01 al 30 de Junio del 2021.

En señal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

RESIDENTE DEL SERVICIO



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

2.3. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE III).

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III del Mantenimiento Rutinario es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	METRADO EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO
MR-100	CONSERVACION DE CALZADA				
MR-101	Limpieza de Calzada	km	33.562	6.941	2.799
MR-102	Bacheo -Camino Tipo I-	m2	33.562	6.605	2.799
MR-104	Remoción de Derrumbes	m3	33.562	11.187	0.000
Sec. 305	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m2	33.562	0.000	0.000
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE				
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.562	7.518	2.920
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.562	13.425	0.000
MR-203	Limpieza de Badén	m2	33.562	13.425	0.000
MR-205	Limpieza de Pontones	und	33.562	13.425	0.000
MR-206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	ml	33.562	0.000	33.562
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN				
MR-301	Roce y Limpieza	m2	33.562	7.518	2.920
MR-400	SEGURIDAD VIAL				
MR-401	Conservación de Señales	und	33.562	0.000	33.562
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL				
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.562	7.182	2.920

III. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO MENSUAL

3.1 Programación del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.06.2021 al 30.06.2021, el avance programado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado	% Avance
25,288.92	7.21%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.06.2021 al 30.06.2021, el avance programado y ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado	% Avance	Avance Ejecutado	% Avance
25,288.92	7.21%	25,288.92	7.21%

3.3 Programación del Siguiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.07.2021 al 31.07.2021, el avance programado ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado	% Avance
20,774.72	5.92%



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617


CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

CONTROL DE AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI"

TOTAL	350,700.00
-------	------------

ITEM	MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		AVANCE MENSUAL	% AVANCE	AVANCE ACUMULADO	% ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	% AVANCE	AVANCE ACUMULADO	% ACUMULADO
01	Mar-21	9,882.40	2.82%	9,882.40	2.82%	9,475.99	2.70%	9,475.99	2.70%
02	Abr-21	23,411.29	6.68%	33,293.68	9.49%	23,411.29	6.68%	32,887.28	9.38%
03	May-21	20,774.72	5.92%	54,068.40	15.42%	20,774.72	5.92%	53,662.00	15.30%
4	Jun-21	25,288.92	7.21%	79,357.32	22.63%	25,288.92	7.21%	78,950.92	22.51%

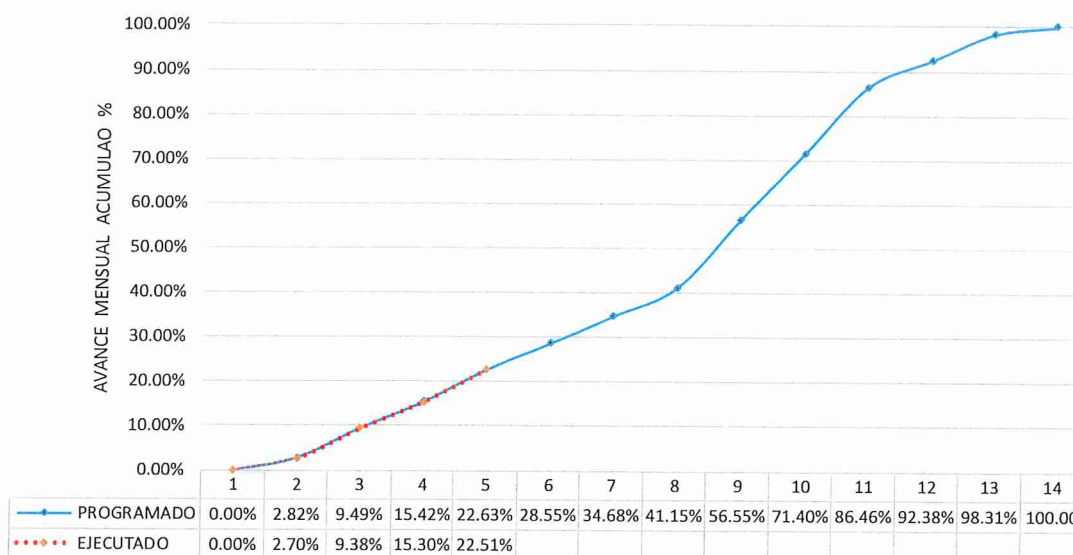

IV. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase III:

Ingeniero Inspector de Servicio

- Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino
- Numero de CIP : 135617
- Teléfono : 976782434
- Correo : kobipc15@hotmail.com
- Fecha de Contrato : 11 de enero de 2021
- Dirección : Calle Atahualpa 303 - Jaén.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

4.2 Herramienta y Materiales

La relación de equipos empleados por el inspector en la Fase III son los siguientes:

- 01 camioneta.
- 01 GPS
- 01 Winchas de 50 m
- 01 Laptop
- 01 Impresora
- Herramientas de Oficina
- Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- La firma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021.
- El inicio del Plazo de la Fase III – Ejecución del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.
- El camino Vecinal Chunchuquillo – virgen del Carmen – la Huaca – chontali, se encuentra en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD.
- El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorización según el siguiente detalle:

Valorización Neta	25,288.92
Monto a Cancelar al Contratista	25,288.92

Se cancelará la suma de 25,288.92 (Veinticinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 92/100 soles)
- El porcentaje de avance del servicio es el 7.21% y el avance real ejecutado acumulado es de 22.51%, frente a un avance acumulado programado de 22.63%, por lo que, la ejecución del servicio se encuentra **ATRASADA** con respecto al monto programado, pero supera el 80% de acuerdo a norma.
- Esta inspección aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorización 04 – junio 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.
- En la presente valorización – junio 2021, corresponde abonar al **INSPECTOR** según lo detallado:

Monto del periodo junio 2021	8,336.33
Retención fiel cumplimiento: 10%	-1,634.85
Monto neto a Cancelar al Inspector	6,701.48

Se cancelará la suma de **S/. 6,701.48** (SEIS MIL SETECIENTOS UNO con 48/100 soles).

5.2 Recomendaciones

- Se recomienda a la **ENTIDAD** tramitar la presente valorización N° 04 de la Fase III correspondiente a la ejecución del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo, dicha valorización a cancelar al **CONTRATISTA** asciende a la suma de 25,288.92 (Veinticinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 92/100 soles).
- Así mismo se recomienda a la **ENTIDAD** tramitar la presente valorización N° 04 de la Fase III correspondiente a la inspección del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo estipulado en su contrato, dicha valorización a cancelar al **INSPECTOR** asciende a la suma de **S/. 6,701.48** (SEIS MIL SETECIENTOS UNO con 48/100 soles).

Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617



VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO:	VIRGEN DEL CARMEN-PALO BLANCO	FECHA:	07/06/2021
COORDENADAS			
ESTE:	716745.000	NORTE:	9364759.000
FOTOGRAFIA N°	01		



DESCRIPCION:	Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)
--------------	--

CONSORCIO CC

Rf.
 **Ramiro Kobi Coronel Camino**
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617

TRAMO:	VIRGEN DEL CARMEN–PALO BLANCO		FECHA:	07/06/2021
COORDENADAS				
ESTE:	716751.000	NORTE:	9364998.000	
FOTOGRAFIA N°	02			



DESCRIPCION:	Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)
--------------	---



Ramiro Kobi
Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617

TRAMO:	VIRGEN DEL CARMEN–PALO BLANCO		FECHA:	07/06/2021
COORDENADAS				
ESTE:	716876.000	NORTE:	9364368.000	
FOTOGRAFIA N°	03			



DESCRIPCION:	Se realiza las Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional dirigido a los trabajadores.
--------------	--

CONSORCIO CC

[Signature]
Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617

TRAMO:	VIRGEN DEL CARMEN-PALO BLANCO	FECHA:	07/06/2021
COORDENADAS			
ESTE:	716755.000	NORTE:	9364919.000
FOTOGRAFIA N°	04		



DESCRIPCION:	Se realiza los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)
--------------	--

CONSORCIO CC



RK
Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617

ANEXO IV
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACIÓN N°04 – JUNIO 2021

CONSORCIO CC

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

FECHA: 05/07/2021

CARTA N°007-2021/CVLH-RL

SEÑOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)

INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 04- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.

De mi especial consideración,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERÚ E.I.R.L Y CORPORACIÓN AVIR S.A.C. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se está remitiendo **(INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 04- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2021)** DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA – CHONTALI. Para su respectiva evaluación y aprobación y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Reyle Cieza Torres
Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

Adjunto

- INFORME N°004-2021-CVLH/RDMS-RO



Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

FECHA: 05/07/2021

CARTA N°007-2021/CVLH-RL

SEÑOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBÍ CORONEL CAMINO)

INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 04- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.

De mi especial consideración,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERÚ E.I.R.L Y CORPORACIÓN AVIR S.A.C. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se está remitiendo **(INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 04- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2021)** DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA – CHONTALI. Para su respectiva evaluación y aprobación y su posterior trámite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Adjunto

- INFORME N°004-2021-CVLH/RDMS-RO

CONSORCIO VIAL LA HUACA
Reyle Cieza Torres
Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL



INFORME MENSUAL – VALORIZACION N°04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA – CHONTALI



**CONSORCIO VIAL LA HUACA
JUNIO**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

ANEXO N° 04

**INFORMES MENSUALES – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: III**

INFORME N°004-2021CVLH/RDMS-RO

1 Información Contractual.

1.1 NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI.

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JAÉN.

1.4 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA

1.5 REPRESENTANTE LEGAL : ING. REYLE CIEZA TORRES

1.6 INSPECTOR : CONSORCIO CC (ING. RAMIRO KOBİ
CORONEL CAMINO)

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN : FASE III: 360 D.C. (MANTENIMIENTO
RUTINARIO) 05 D.C. (INVENTARIO DE
CONDICION VIAL)


1.8 MONTO DE CONTRATO : S/. 2, 338,000.00 (SIN IGV)

1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/. 350, 700.00

1.10 FECHA DE INICIO : 19 DE MARZO 2021 (MANT. RUTINARIO)

1.11 FECHA DE CULMINACIÓN : 18 DE MARZO 2022

1.12 PERIODO DE EJECUCIÓN : 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

2. REPORTE DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

El Alcalde del Distrito de : Jaén
 Provincia : Jaén
 Departamento : Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa "CONSORCIO VIAL LA HUACA" viene realizando los trabajos de Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, según el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021 es :

Estado de transpirabilidad	Restricciones del camino	Evaluación (marcar con un aspa)
Bueno	Ninguna	()
Regular	Algunas	(X)
Malo	Bastantes	()

.....
 Sello y Firma del Alcalde

 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN**
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Ing. Arturo Pachón de la Cruz
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA


Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

2.2 ACTA DE CONSTATACIÓN DE TRABAJO.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTRATISTAACTA DE CONSTATAACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento : km 0+000 km 33+562

Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde del día 30 de Junio del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSÉ REGALADO INGA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBİ CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la presente acta de constatación de trabajos N°4 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluación y a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente acta de VENTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 92/100 (S/ 25,288.92) correspondiente a los trabajos realizados durante los días, comprendidos entre el 01 al 30 de Junio del 2021.

En señal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

RESIDENTE DEL SERVICIO

Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617
INSPECTOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN


CONSORCIO VIAL LA HUACA

CARGAS DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	METRADO EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO
MR-100	CONSERVACION DE CALZADA				
MR-101	Limpieza de Calzada	km	33.562	6.941	2.799
MR-102	Bacheo -Camino Tipo I-	m2	33.562	6.605	2.799
MR-104	Remoción de Derrumbes	m3	33.562	11.187	0.000
Sec. 305	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m2	33.562	0.000	0.000
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE				
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.562	7.518	2.920
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.562	13.425	0.000
MR-203	Limpieza de Badén	m2	33.562	13.425	0.000
MR-205	Limpieza de Pontones	und	33.562	13.425	0.000
MR-206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	ml	33.562	0.000	33.562
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN				
MR-301	Roce y Limpieza	m2	33.562	7.518	2.920
MR-400	SEGURIDAD VIAL				
MR-401	Conservación de Señales	und	33.562	0.000	33.562
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL				
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.562	7.182	2.920

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	METRADO EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMUALDO	SALDO
MR-100	CONSERVACION DE CALZADA						
MR-101	Limpieza de Calzada	km	33.562	6.941	2.799	9.740	23.822
MR-102	Bacheo -Camino Tipo I-	m2	33.562	6.605	2.799	9.404	24.158
MR-104	Remoción de Derrumbes	m3	33.562	11.187	0.000	11.187	22.375
Sec. 305	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m2	33.562	0.000	0.000	0.000	33.562
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE						
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.562	7.518	2.920	10.438	23.124
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.562	13.425	0.000	13.425	20.137
MR-203	Limpieza de Badén	m2	33.562	13.425	0.000	13.425	20.137
MR-205	Limpieza de Pontones	und	33.562	13.425	0.000	13.425	20.137
MR-206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	ml	33.562	0.000	33.562	33.562	0.000
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN						
MR-301	Roce y Limpieza	m2	33.562	7.518	2.920	10.438	23.124
MR-400	SEGURIDAD VIAL						
MR-401	Conservación de Señales	und	33.562	0.000	33.562	33.562	0.000
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL						
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.562	7.182	2.920	10.102	23.460


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



3 PROGRAMACIÓN DE TRABAJO MENSUAL 3.1. PROGRAMACIÓN REAL EJECUTADO



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 04-JUNIO 2021

SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	COSTO S/	VALORIZACIÓN ANTERIOR			EJECUTIVO			ACUMULADO			SALDO		
					METRADO	TOTAL S/	AVANCE %	METRADO	TOTAL S/	AVANCE %	METRADO	TOTAL S/	AVANCE %	METRADO	TOTAL S/	AVANCE %
MR-00	CONSERVACION DE CALZADA															
MR-01	Limpieza de Calzada	km	33.552	S/ 3,702.59	6.941	755.689	20.69%	2.759	308.79	8.34%	9.740	1,074.48	28.02%	23.822	2,628.08	70.98%
MR-02	Bacheo-Carroz Tipo I-	=	33.552	S/9,678.04	6.835	19,223.196	19.88%	2.759	8,145.42	8.34%	9.404	27,889.61	28.02%	24.158	70,339.23	71.98%
MR-04	Remoción de Derribos	m3	33.552	S/ 105.162	11.187	617.207	33.33%				11.187	617.21	33.33%	22.375	1,234.41	66.67%
Soc. 305	Pavimento de la superficie sin aporte de material	m2	33.552	S/80,213.8							0.000	0.00	0.00%	33.552	80,213.18	100.00%
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE															
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.552	S/ 5,438.52	7.518	3,453.228	22.40%	2.920	1,343.15	8.76%	10.438	4,801.38	31.10%	23.124	10,637.14	63.90%
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.552	S/ 2,716.92	13.425	1,110.765	40.00%				13.425	1,110.77	40.00%	20.137	1,668.15	60.00%
MR-203	Limpieza de Bacheo	m2	33.552	S/ 1,755.96	13.425	702.394	40.00%				13.425	702.38	40.00%	20.137	1,653.59	60.00%
MR-205	Limpieza de Pozos	und	33.552	S/944.48	13.425	365.732	40.00%				13.425	365.73	40.00%	20.137	548.69	60.00%
MR-208	Encausamiento de Papeles Cursos de Agua	ml	33.552	S/ 3,242.09				33.552	3,242.09	100.00%	33.552	3,242.09	100.00%	0.000	0.00	0.00%
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN															
MR-301	Riegos y Limpieza	m2	33.552	S/ 4,539.97	7.518	1,014.915	22.40%	2.920	394.19	8.76%	10.438	1,409.10	31.10%	23.124	3,121.77	63.90%
MR-400	SEGURIDAD VIAL															
MR-401	Conservación de Señales	und	33.552	S/616.67				33.552	616.67	100.00%	33.552	616.67	100.00%	0.000	0.00	0.00%
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL															
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.552	S/ 86,750.06	7.182	18,584.73	21.40%	2.920	7,547.34	8.76%	10.102	25,112.07	30.10%	23.430	60,639.39	69.90%
Costo Directo				299,465.76		45,822.91	15.30%		21,594.05	7.21%		67,417.55	22.51%		232,051.23	77.49%
Costos Generales		11.96%		35,805.59		5,479.21	15.30%		2,582.15	7.21%		8,061.36	22.51%		27,747.22	77.49%
Utilidad		5.15%		15,422.84		2,359.88	15.30%		1,112.12	7.21%		3,472.00	22.51%		11,950.84	77.49%
TOTAL				350,700.00		53,662.00	15.30%		25,288.92	7.21%		70,950.92	22.51%		271,749.08	77.49%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

3.2. PROGRAMACIÓN DEL MES.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI"						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	COSTO S/	PROGRAMADO (JUNIO)	
					METRADO	AVANCE %
MR-100	CONSERVACION DE CALZADA					
MR-101	Limpieza de Calzada	km	33.562	S/ 3,702.56	2.799	S/ 308.79 8.34%
MR-102	Bacheo -Camino Tipo I-	m2	33.562	S/ 97,678.84	2.799	S/ 8,146.42 8.34%
MR-104	Remoción de Derrumbes	m3	33.562	S/ 1,851.62	0.000	S/ 0.00 0.00%
Sec. 305	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m2	33.562	S/ 80,213.18	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE					
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.562	S/ 15,438.52	2.920	S/ 1,343.15 8.70%
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.562	S/ 2,776.92	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-203	Limpieza de Badén	m2	33.562	S/ 1,755.96	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-205	Limpieza de Pontones	und	33.562	S/ 914.48	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	ml	33.562	S/ 3,242.09	33.562	S/ 3,242.09 100.00%
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN					
MR-301	Roce y Limpieza	m2	33.562	S/ 4,530.87	2.920	S/ 394.19 8.70%
MR-400	SEGURIDAD VIAL					
MR-401	Conservación de Señales	und	33.562	S/ 612.67	33.562	S/ 612.67 100.00%
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL					
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.562	S/ 86,751.06	2.920	S/ 7,547.34 8.70%
Costo Directo						
Gastos Generales				S/ 299,468.78		S/ 21,594.65 7.21%
Utilidad		11.96%		S/ 35,808.58		S/ 2,582.15 7.21%
TOTAL		5.15%		S/ 15,422.64		S/ 1,112.12 7.21%
				S/ 350,700.00		S/ 25,288.92 7.21%
% MENSUAL					7.21%	


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

3.3. PROGRAMACIÓN DEL SIGUIENTE MES.

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI"						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	COSTO S/	PROGRAMADO (JULIO)	
					METRADO	AVANCE %
MR-100	CONSERVACION DE CALZADA					
MR-101	Limpieza de Calzada	km	33.562	S/ 3,702.56	2.799	S/ 308.79 8.34%
MR-102	Bacheo -Camino Tipo I-	m2	33.562	S/ 97,678.84	2.799	S/ 8,146.42 8.34%
MR-104	Remoción de Derrumbes	m3	33.562	S/ 1,851.62	0.000	S/ 0.00 0.00%
Sec. 305	Perfilado de la superficie sin aporte de materia	m2	33.562	S/ 80,213.18	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE					
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.562	S/ 15,438.52	2.920	S/ 1,343.15 8.70%
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.562	S/ 2,776.92	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-203	Limpieza de Badén	m2	33.562	S/ 1,755.96	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-205	Limpieza de Pontones	und	33.562	S/ 914.48	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	ml	33.562	S/ 3,242.09	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN					
MR-301	Roce y Limpieza	m2	33.562	S/ 4,530.87	2.920	S/ 394.19 8.70%
MR-400	SEGURIDAD VIAL					
MR-401	Conservación de Señales	und	33.562	S/ 612.67	0.000	S/ 0.00 0.00%
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL					
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.562	S/ 86,751.06	2.920	S/ 7,547.34 8.70%
Costo Directo				S/ 299,468.78	0.000	S/ 17,739.89 5.92%
Gastos Generales		11.96%		S/ 35,808.58	0.000	S/ 2,121.22 5.92%
Utilidad		5.15%		S/ 15,422.64	0.000	S/ 913.60 5.92%
TOTAL				S/ 350,700.00	0.000	S/ 20,774.72 5.92%
% MENSUAL					5.92%	


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

4. RECURSOS UTILIZADOS.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



4.1. RECURSOS HUMANOS.

Relación de personal técnico

Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	CARGO	DNI	Sexo
Juan José	REGALADO	INGA	Ing. Residente	CIP. N 123648	M
Fernando	JARA	DÍAZ	Ing. Asistente	70900207	M
Consortio cc Ing. Ramiro Kobi	CORONEL	CAMINO	Ing. Inspector	CIP. N° 135617	M

Relación de personal mano de obra no calificada (peones)

NOMBRES	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO	DNI	SEXO
Grahambell	ABAD	FLORES	JEFE DE CUADRILLA	48081362	M
Alex Heisten	ROJAS	OCHOA	OPERADOR	42813930	M
Nolver	QUINTANA	VASQUEZ	PEÓN	74652121	M
Hernesto Luzbel	PACHAMORA	ESTELA	PEÓN	71079886	M
Wilban	MORALES	VASQUEZ	PEÓN	74652133	M
Gilmer	BARTUREN	CORONEL	PEÓN	46883933	M
Eulis Kevin	MORALES	CHEVEZ	PEÓN	76757137	M


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



4.2. Herramientas y materiales

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ítem.	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD
01	PALANAS RECTAS	TRUPER	UND	5
02	PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA	TRUPER	UND	5
03	BARRETAS DE FIERRO	TRUPER	UND	5
04	MACHETES	GAVILAN	UND	5
05	BUGGUES	TRUPER	UND	2
06	LIMAS		UND	5
07	CONOS DE FIBRA -		UND	2
08	MASCARILLAS PARA PREVENCIÓN COVID 19	NOTEX	UND	50
09	CHALEADORA	STHIL	UND	01
10	COMPACTADORA	KOHLER 9.5 HP		01
11	MOTO CARGERA	ZONGSHEN	UND	01

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

000100

CONSORCIO VIAL LA HUACA


5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



5.1. Conclusiones.

- Se ha cumplido en el periodo junio de 2021, con el objetivo de carácter permanente de conservar las condiciones de la vía, teniendo en cuenta criterios de control de calidad, protocolos de seguridad y emergencia sanitaria.
- El porcentaje de avance de la ejecución de las actividades de obra real acumulada está en un 22.51% al 30 de junio del 2021.
- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.12 % con respecto a lo programado (acumulado programado 22.51%) para el mes de junio.

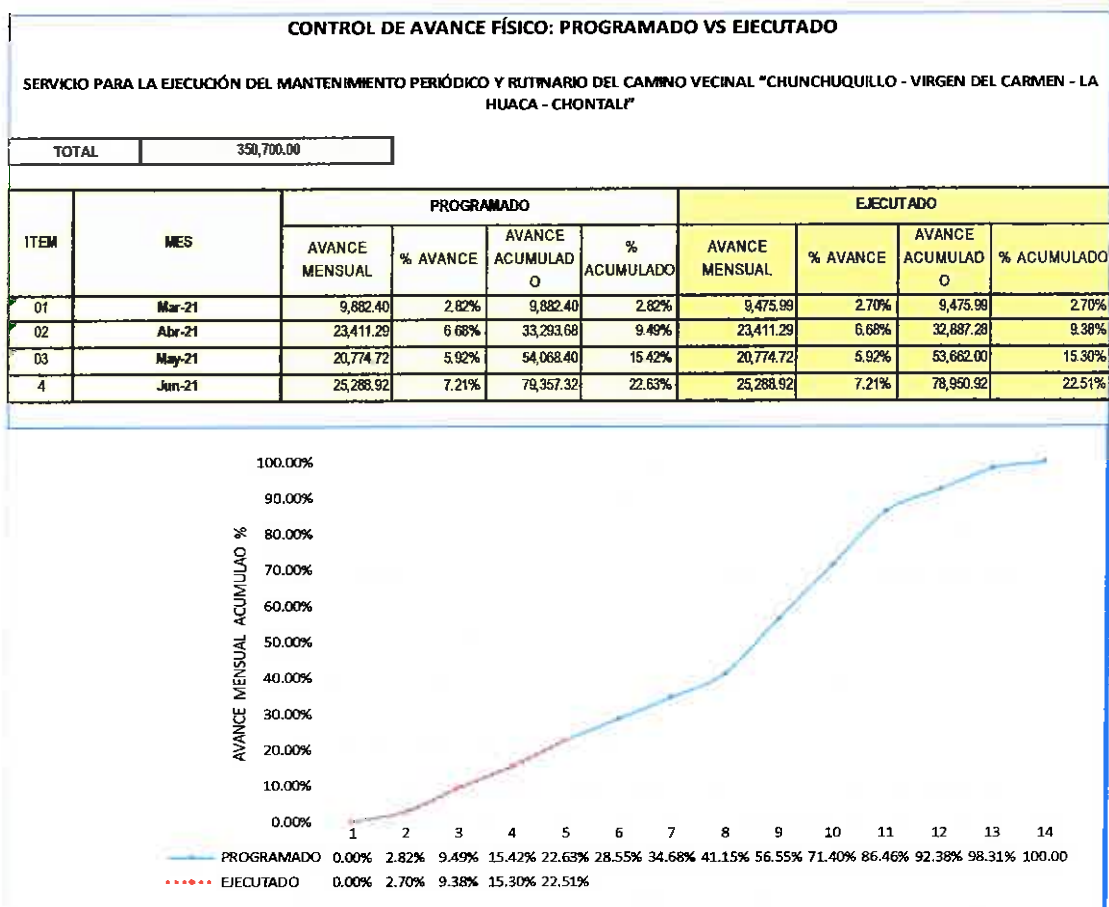



Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648



-El monto valorizado correspondiente al mes de junio asciende a s/
25,288.92 (veinte cinco mil doscientos ochenta y ocho con 92/100 soles)

5.2. Recomendaciones.

- Realizar el trámite correspondiente de revisión, aprobación y pago del servicio de mantenimiento rutinario Periodo junio 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.
- Se recomienda la continuación de este tipo de proyectos que generan que los pueblos del país estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecución del servicio del servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa tener los caminos vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a los pueblos y que el comercio se desarrolle. En resumen, que el país progrese.
- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante para una nación. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy dinámicos, ya que requieren una evaluación constante para tomar las medidas a tiempo y mantener la transitabilidad de la vía y, por ende, el buen servicio de los usuarios.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



6. PANEL FOTOGRÁFICO.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648


SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali	
FECHA	02/06/2021	
COORDENADAS		
ESTE	NORTE	
716740.44	9364878.19	
FOTOGRAFIA	N° 01	
Descripcion		
Se esta realizando la actividad de limpieza de calzada, en la imagen se muestra el apropiado precedimiento para luego poner el material de cantera.		
		

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali	
	FECHA	04/06/2021
	COORDENADAS	
	ESTE	NORTE
	716757.82	936500.23
	FOTOGRAFIA	N°02
	DESCRIPCION	
Se esta realizando la actividad de bacheo, se humedece el material de cantera para luego ser compactada.		
 Ing. Juan José Regalado Inga RESIDENTE DE OBRA CIP: 123648		

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali		
FECHA	09/06/2021		
COORDENADAS			
ESTE	NORTE		
716619.51	9365715.74		
FOTOGRAFIA	N° 03		
Descripcion			
Se muestra que se agrego el material de cantera (BACHEO), se compacta con la ayuda de los equipos y herramientas.			




SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali		
FECHA	12/06/2021		
COORDENADAS			
ESTE	NORTE		
716688.35	9365980.91		
FOTOGRAFIA	N° 04		
Descripcion			
Se compacta hasta que alla llegado a la dosificacion requerida.			


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
	FECHA	14/06/2021		
	COORDENADAS			
	ESTE	NORTE		
	716705.03	9366102.12		
	FOTOGRAFIA	N°05		
	DESCRIPCION			
	Se muestra en la foto el trabajo de la actividad de bacheo			
				

Se muestra en la foto el trabajo de la actividad de bacheo


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali		
FECHA	24/06/2021		
COORDENADAS			
ESTE	NORTE		
716551.02	9366410.70		
FOTOGRAFIA	N° 06		
Descripcion			
			

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
COORDENADAS				
ESTE	716774.52	NORTE	93649970.23	
FOTOGRAFIA	N°07		FECHA	02/06/2021
				
Descripcion:	Se esta realizando la actividad de limpieza de cunetas con la ayuda de herramientas y personal en campo			

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
FECHA	04/06/2021			
COORDENADAS				
ESTE	NORTE			
716698.90	9365101.35			
FOTOGRAFIA	N° 08			
Descripcion				
Se continua realizando la actividad de limpieza de cunetas de a cuerdo a las partidas de cada mes.				
				
 Ing. Juan José Regalado Inga RESIDENTE DE OBRA CIP: 123648				

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
COORDENADAS				
ESTE	716698.79	NORTE	9366065.88	
FOTOGRAFIA	N°09		FECHA	18/06/2021
				
Descripcion:	Se esta realizando la actividad de Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua.			

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
COORDENADAS				
ESTE	716635.48	NORTE	936599.61	
FOTOGRAFIA	N°10		FECHA	18/06/2021
				
Descripcion:	Se muestra al personal en campo trabajando en los encauzamientos de aguas.			


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
COORDENADAS				
ESTE	716648.80	NORTE	9366189.93	
FOTOGRAFIA	N°11		FECHA	19/06/2021
				
Descripcion:				

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
COORDENADAS				
ESTE	716678.90	NORTE	9365471.17	
FOTOGRAFIA	N°12		FECHA	05/06/2021
				
Descripcion:	Se esta realizando la actividad de Roce y limpieza.			


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali										
	FECHA	03/06/2021									
	COORDENADAS										
	ESTE	NORTE									
	716678.30	9365252.12									
	FOTOGRAFIA	N°13									
	DESCRIPCION										
Se continua realizando la actividad de Roce y limpieza con la ayuda de las diferentes herramientas y personal en campo.											
 Ing. Juan José Regalado Inga RESIDENTE DE OBRA CIP: 123648											

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
COORDENADAS				
ESTE	717681.06	NORTE	9357385.99	
FOTOGRAFIA	N°14		FECHA	17/06/2021
				
Descripcion:	Se esta realizando la actividad de Conservacion de señales.			

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali			
	FECHA	17/06/2021		
	COORDENADAS			
	ESTE	NORTE		
	716650.49	9365551.06		
	FOTOGRAFIA	N°15		
	DESCRIPCION			
	Se vvisualiza en la imagenen como esta quedadonde los diferentes señales de trancito.			

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali		
	FECHA	19 /06/2021	
	COORDENADAS		
	ESTE	NORTE	
	716976.28	9362890.87	
	FOTOGRAFIA	N°16	
	DESCRIPCION		
	Se elimina la maleza de los costados de la plataforma donde se ubica los letreros.		
 Ing. Juan José Regalado Inga RESIDENTE DE OBRA CIP: 123648			

SERVICIO DE	Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo – Virgen del Carmen – La Huaca – Chontali	
FECHA	18/06/2021	
COORDENADAS		
ESTE	NORTE	
717729.79	9357776.71	
FOTOGRAFIA	Nº 17	
Descripcion		
Se visualiza en la imagen que se esta realizando el trabajo de conservación de señales.		
		


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario del

Propietario: Comité Vecinal Chunchuquillo - Virgen del Carmen - Ta Huaca - Chontali

Dirección: Jaen - Cajamarca

Contratista: Consorcio Vial Ta Huaca

FECHA

ASIENTO N. 117 DEL INSPECTOR 31/05/2021

- Con presencia del residente se realizó el recorrido en los cuales se intervino para validar los trabajos y/o Metrados presentados por el Residente del servicio, corroborándose las metas propuestas según cronograma ejecutados en el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

ASIENTO N. 118: DEL RESIDENTE DE OBRA Martes 01/06/2021

- Se dan inicio a los Trabajos de mantenimiento rutinario en el mes de Junio.
- Se otorga los charlos de seguridad y salud ocupacional en obra
- Se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino Vecinal Chunchuquillo Virgen del Carmen - Ta Huaca - Chontali
- Se dan inicio a los Trabajos en el KM 17+200 hacia el KM 33+562
- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza, Limpieza de cunetas, Vigilancia y Control.

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N. 119 DEL INSPECTOR 01/06/2021

- Se constata in situ el inicio de las actividades correspondientes al mes de Junio, de acuerdo al cronograma programado presentado en el plan de trabajo por el contratista y aprobado por la entidad.
Se constata los trabajos de: Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza, Limpieza de cunetas, Vigilancia y Control. los cuales se realizan en el Km. 17+200 hacia el Km. 18+000

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Faltante

Propietario: Comino Vecinal Chunchugullo - Virgen del Carmen - La Paz - Chuaco - Chiriqui

Dirección: Jaen - Cajamarca

Contratista: Consorcio Vial To Huaca


FECHA

ASIENTO N° 120 DEL RESIDENTE DE OBRA Miércoles 02/06/2021

El día de hoy se contó con la visita de inspección por parte de Ing. monitor del servicio por parte de la entidad donde se realizó un recorrido junto con el supervisor por el Tramo intervenido verificando el correcto trabajo que viene realizando el contratista e así mismo constató los siguientes trabajos:

se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario en el K.M. 17, las actividades desarrolladas son las siguientes:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 121 DEL INSPECTOR 02/06/2021

- Se constata la presencia del Ing. monitor del servicio por parte de la entidad, realizándose un recorrido con la presencia del Residente donde se verificó los trabajos en el Km. 17:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas




Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP: N° 135617

ASIENTO N° 122 DEL RESIDENTE DE OBRA Jueves 03/06/2021

se continúan con las actividades de mantenimiento en el Km. 17

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE




Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP: N° 135617

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario: Camino Vecinal chunchugullo Virgen del Carmen - Ta Huaca - Chontali

Dirección: Jaen - Cajamarca

Contratista: Consorcio vial Ta Huaca

FECHA

ASIENTO N° 123 DEL INSPECTOR

03/06/2021

- Se constata la continuación de los trabajos en el Km. 17+200 hacia el Km. 18+000:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

ASIENTO N° 24: DEL RESIDENTE DE OBRA Viernes 04/06/2021

se continúan con los trabajos de mantenimiento del servicio de mantenimiento Periódico y Rutinario del camino Vecinal chunchugullo Virgen del Carmen - Ta Huaca - Chontali

se continúan con los trabajos en el Km 17

- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza y Limpieza de cunetas.
 - cabe resaltar los equipos y mano de obra utilizados para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario para las siguientes:
- Equipos/ Peones
- 01 chalcadora
 - 01 compactador
 - 01 Moto cargadora
 - 07 peones

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 125 DEL INSPECTOR

04/06/2021

- Se constata los trabajos de: limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza y limpieza de cunetas realizados en el Km. 17

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

INSPECTOR


CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino
 Propietario: Vecino Chundaguillo - Virgen del Carmen - La Huaca - Chantoli
 Dirección: Jaen - Cajamarca
 Contratista: Consorcio Vial La Huaca

FECHA

ASIENTO N° 126: DEL RESIDENTE DE OBRA sábado 05/06/2021

El día de hoy se continúa con las actividades de mantenimiento rutinario descritas en el plan de trabajo y aprobadas por la entidad, desarrollándose las siguientes actividades:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

ASIENTO N° 127 DEL INSPECTOR 05/06/2021

- Se verifica la continuación de los trabajos:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas




 Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP: N° 135617

ASIENTO N° 128: DEL RESIDENTE DE OBRA Lunes 07/06/2021

- se realiza las charlas de seguridad y salud ocupacional en obra.
- se continúa con las actividades de mantenimiento rutinario en el km 17
- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza de cunetas


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648


ASIENTO N° 129 DEL INSPECTOR 07/06/2021

- Se constata las Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional realizado por el Residente hacia los trabajadores.
- Se constata la continuación de los trabajos de: limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza y limpieza de cunetas.


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

ING. RESIDENTE




 Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP: N° 135617

Univisat

CUADERNO DE LA OBRA: *Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino*

Propietario: *Vecinal chunchugullo-Virgen del Lirio-La Huaca-Chuntal*

Dirección: *Jam - Cajamarca*

Contratista: *Consorcio vial La Huaca*

FECHA

ASIENTO N° 130 DEL RESIDENTE DE OBRA *Mañes 08/06/2021*
 se continúan desarrollando con normalidad con los trabajos de mantenimiento rutinario en el KM 18
 - Limpieza de calzada
 - Bacheo
 - Poca y Limpieza
 - Limpieza de curvas
 - Vigilancia y control (recorrido por la vía)

[Firma]
 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

ASIENTO N° 131 DEL INSPECTOR *08/06/2021*
 - Se verifica la continuación de los siguientes trabajos entre el Km. 18+000 hacia el Km. 19+000:
 - Limpieza de calzada
 - Bacheo
 - Poca y Limpieza
 - Limpieza de curvas
 - Vigilancia y control



[Firma]
 Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617

ASIENTO N° 132 DEL RESIDENTE DE OBRA *Miércoles 09/06/2021*
 - se realizó los charlos de seguridad y salud ocupacional en obra
 - el día de hoy se contó con la visita de inspección por parte del ing. monitor del servicio por parte de la entidad, donde se realizó un recorrido junto con el supervisor por el tramo intervenido verificando el correcto trabajo que viene realizando el contratista, así mismo constató los siguientes trabajos
 - se continúa con las actividades de mantenimiento rutinario en el KM 18
 - Limpieza de calzada, Bacheo, Poca y Limpieza y Limpieza de curvas

[Firma]
 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648



[Firma]
 Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617

ING. RESIDENTE

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: *Mantenimiento Periódico y Rutinario*Propietario: *Vecinal chunchuquillo Virgen del Carmen La Huaca chuntali*Dirección: *Joan Lajarrorca*Contratista: *Consorcio viol Ta Huaca*

FECHA

ASIENTO N° 133 DEL INSPECTOR 09/06/2021

- Se constata la realización de los charlas de Seguridad y Salud Ocupacional dirigida a los trabajadores.

Con presencia del Ing. monitor del servicio por parte de la entidad se constata los siguientes trabajos:

- Limpieza de calzada y Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

ASIENTO N° 134: DEL RESIDENTE DE OBRA JUEVES 10/06/2021

se continúan con las actividades de mantenimiento rutinario en el KM 18

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 135 DEL INSPECTOR 10/06/2021

- Se constata la continuación de los siguientes trabajos entre el Km. 18+000 al Km. 19+000

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

ASIENTO N° 136: DEL RESIDENTE DE OBRA Viernes 11/06/2021

se continúan con las actividades de mantenimiento del servicio de mantenimiento Periódico y Rutinario del camino Vecinal chunchuquillo - Virgen del Carmen - Ta Huaca - chuntali

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Hircasol

ING. RESIDENTE

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario
Propietario: Camino Vecinal - Chunchugilla - Virgen del Carmen - La Huaca - Chontali
Dirección: Jaen - Cajamarca
Contratista: Consorcio Vial La Huaca



FECHA

ASIENTO N° 137 DEL INSPECTOR 11/06/2021

- Se constata la continuación de los trabajos del Mantenimiento Rutinario entre el Km. 18+000 hacia el Km. 19+000



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

ASIENTO N° 138: DEL RESIDENTE DE OBRA sábado 12/06/2021

El día de hoy se desarrollaron las siguientes actividades de mantenimiento rutinario en el KM 18

- Limpieza de calzada, Bacheo, Limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 139 DEL INSPECTOR 12/06/2021

Se verifica los trabajos realizados entre el Km. 18+000 hacia el Km. 19+000:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

ASIENTO N° 140: DEL RESIDENTE DE OBRA Lunes 14/06/2021

- se realizó las charlas de seguridad y salud ocupacional en obra
- se continúan con las actividades de Mantenimiento rutinario de Camino Vecinal Chunchugilla - Virgen del Carmen - La Huaca - Chontali
- Los Trabajos se continúan en el KM 18

- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza y Limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

.....
ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Universal

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino

Propietario: Vecinal Chanchugillo - Virgen del Carmen Ta Huaca - Chontali

Dirección: Joan - Luján

Contratista: Consortio Vial Ta Huaca

FECHA

ASIENTO N° 141 DEL INSPECTOR 14/06/2021

- Se constata los trabajos que se vienen realizando entre el Km. 18+000 hacia el Km 19+000:

- Limpieza de calzada y Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 142: DEL RESIDENTE DE OBRA Moles 15/06/2021

El día de hoy se iniciaron los trabajos de mantenimiento en el KM 18

- Limpieza de calzada, Bacheo y Roca y Limpieza, C/

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 143 DEL INSPECTOR 15/06/2021

- Se constata los siguientes trabajos realizados:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento 144: DEL RESIDENTE DE OBRA Moles 16/06/2021

El día de hoy se realizó con la visita de inspección por parte del Ing. monitor del servicio por parte de la entidad donde se realiza un recorrido junto con el supervisor por el tramo intervenido verificando el correcto trabajo que viene realizando el contratista.

Casi mismo se constató los siguientes trabajos en el KM 18

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario del CaminoPropietario: Neural chonchoquillo - Virgen del Carmen - Ta HuacaDirección: Jom - CajamarcaContratista: Consorcio vial Ta Huaca

FECHA

ASIENTO N° 145 DEL INSPECTOR 16/06/2021

- Se constata la presencia del Ing. monitor del servicio por parte de la entidad, realizándose un recorrido con presencia del Residente verificándose los trabajos que se vienen realizando hasta la fecha.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 146: DEL RESIDENTE DE OBRA JUEVES 17/06/2021

- Se iniciaron los trabajos de mantenimiento, se agropo 2 frentes
- Frente 01 KM 17+200 hacia KM 0+000
- Frente 02 KM 17+200 hacia KM 33+562

se realizaron las actividades

- Conservación de señales
- Encasamientos de pequeños cursos de agua

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 147 DEL INSPECTOR 17/06/2021

- Se constata los trabajos de conservación de señales y encasamientos de cursos de agua realizados en el Km. 17+200 al Km. 0+000 y en el Km. 17+200 - Km. 33+500



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 148: DEL RESIDENTE DE OBRA VIERNES 18/06/2021

se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario

- Frente 01 KM 17+200 hacia 0+000
- Frente 02 KM 17+200 hacia 33+562

se realizaron los siguientes trabajos

- Conservación de señales
- Encasamientos de pequeños cursos de agua

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR

000077

49

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Pavedido y Rutinario del Camino
 Propietario: Vecinos Chunchuguito Virgen del Carmen - Ta Huaca - Chontolo
 Dirección: John - Pajamarca
 Contratista: Consorcio vial Ta Huaca

FECHA

ASIENTO N° 149 DEL INSPECTOR 18/06/2021

- Se continua con los trabajos de conservación de señales y encauzamiento de cauces de agua.

Se constata que los trabajos se realizaron entre el km. 17+200 al km 0+000 y entre el km. 17+200 al km. 33+500



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 150 : DEL RESIDENTE DE OBRA Sábado 19/06/2021

se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario

el día de hoy se ejecutaron las partidas descritas a continuación al 100% con los días ejecutados mencionados en los asientos anteriores

- Frente 01 KM 17+200 hacia KM 0+000

- Frente 02 KM 17+200 hacia KM 33+562

se realizaron las siguientes actividades

- Conservación de señales

- Encauzamiento de pequeñas cursos de agua

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 151 DEL INSPECTOR 19/06/2021

Se constata la continuación de los trabajos descritos en el asiento N° 150.

Se hizo la recomendación al Residente de priorizar los trabajos de Bacheo en los tramos de la vía donde requieran inmediata intervención.

Se hizo la recomendación al Residente de priorizar los trabajos de limpieza de Bacheos en los Puntos más críticos de la vía.

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino
 Propietario: Veredal chunchoguillo-Vigen del Carmen-Ta Huaco-Chontali
 Dirección: Jam - Cojorica
 Contratista: Pensado viol Ta Huaco - chontali

FECHA

ASIENTO N° 152: DEL RESIDENTE DE OBRA Lunes 21/06/2021

- Se realizó las charlas de seguridad y salud ocupacional en obra
 - se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario en el KM 18
 - Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza,

Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

ASIENTO N° 153 DEL INSPECTOR 21/06/2021

- Se constata la realización de las charlas de Seguridad y Salud Ocupacional dirigida a los trabajadores.
 - Se constata la continuación de los trabajos de limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza y limpieza de curvas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP: N° 135617

ASIENTO N° 154: DEL RESIDENTE DE OBRA Martes 22/06/2021

- Se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario en el KM 18
 - Limpieza de calzada, Roca y Limpieza, Limpieza de curvas

Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

ASIENTO N° 155 DEL INSPECTOR 22/06/2021

- Se constata la continuación de los siguientes trabajos realizados en el Km. 18
 - Limpieza de calzada
 - Roca y Limpieza
 - Limpieza de curvas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP: N° 135617

ASIENTO N° 156: DEL RESIDENTE DE OBRA Miércoles 23/06/2021

- El día de hoy se contó con la visita de inspección por parte del Ing. monitor del servicio por parte de la entidad, donde se realizó un recorrido junto con el supervisor por el terreno intervenido verificando el correcto trabajo que viene realizando el contratista así mismo se constató los siguientes trabajos en el KM 19
 - Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza, Limpieza de curvas

Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648
 ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y Rutinario de Camino
 Propietario: Unión Chunchuquito- Virgen del Poder- La Huaca- Chontota
 Dirección: Jam - Cajamarca
 Contratista: Peruvaria vial La Huaca

FECHA

ASIENTO N° 157 DEL INSPECTOR 23/06/2021

- Se constata la visita del ingeniero monitor del servicio por parte de la entidad.
- Se constata los trabajos realizados en el Km. 19.
- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP: N° 135617

Asiento N° 158: DEL RESIDENTE DE OBRA Jueves 24/06/2021

- Se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario descritos en el plan de Trabajo y aprobados por la entidad.
- Los trabajos continúan en el KM 19
- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza, Limpieza de cunetas.

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 159 DEL INSPECTOR 24/06/2021

- Se constata la continuación de los siguientes trabajos:
- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y Limpieza
- Limpieza de cunetas.



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP: N° 135617

Asiento N° 160: DEL RESIDENTE DE OBRA Viernes 25/06/2021

- se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario en el KM 19
- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y Limpieza, Limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP: N° 135617

ING. RESIDENTE

00007452

CUADERNO DE LA OBRA: *Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino*Propietario: *Vecinal chunchuquilla - Virgen del Carmen - Ta Huaca - Chontali*Dirección: *Jam - Cajamarca*Contratista: *Lansorcio Viel Ta Huaca*

FECHA

ASIENTO N° 161 DEL INSPECTOR 25/06/2021

- Se constata la continuación de los siguientes trabajos en el km. 19:

- Limpieza de calzada
- Bacheo
- Roca y limpieza
- Limpieza de cunetas



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 162: DEL RESIDENTE DE OBRA sábado 26/06/2021

se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario descritos en el plan de trabajo y aprobados por la entidad.

- Los trabajos se continúan desarrollando en el km 19
- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza, limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ASIENTO N° 163 DEL INSPECTOR 26/07/2021

- Se verifica la continuación de los trabajos de: limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza y limpieza de cunetas



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 164: DEL RESIDENTE DE OBRA Lunes 28/06/2021

- se realizó las charlas de seguridad y salud ocupacional en obra
- se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario del camino Vecinal chunchuquilla Virgen del Carmen Ta Huaca - Chontali en el km 19
- Limpieza de calzada, Bacheo, Roca y limpieza y limpieza de cunetas

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

CUADERNO DE LA OBRA: *Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino*Propietario: *Vecinal chunchugullo-Viagen del Carmen To Huaca-Chontab*Dirección: *Jaen - Pajamirca*Contratista: *Consorcio vial To Huaca*

FECHA

ASIENDO N° 165 DEL INSPECTOR. 28/06/2021

- Se constata la realización de los Checos de Seguridad.
- Se constata los trabajos descritos en el asiendo N° 164
- Se le sugiere al Residente convocar al Representante legal del consorcio contratista y al Ing. monitor del servicio para realizar un recorrido de la vía y verificar el estado en el que se encuentra.



Ramiro Kobi Coronel Camina
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

Asiento N° 166: DEL RESIDENTE DE OBRA Miércoles 30/06/2021

- cabe mencionar que la fecha 29/06/2021 se suspendieron por celebrarse San Pedro y San Pablo (Feriado no favorable)
- El día de hoy en presencia del inspector se realiza el recorrido del tramo con la finalidad de verificar los metros ejecutados hasta el cierre del presente mes y así proceder a ejecutar la valoración correspondiente al mes de junio 2021, a continuación se mencionan los partidas ejecutados y sus respectivos metros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	EJECUTADO
MR-100	CONSERVACION DE CALZADA			
MR-101	Limpieza de Calzada	km	33.562	2.799
MR-102	Bacheo -Camino Tipo I-	m2	33.562	2.799
MR-104	Remoción de Derrumbes	m3	33.562	0.000
Sec. 305	Perfilado de la superficie sin aporte de material	m2	33.562	0.000
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE			
MR-201	Limpieza de Cunetas	ml	33.562	2.920
MR-202	Limpieza de Alcantarilla	und	33.562	0.000
MR-203	Limpieza de Badén	m2	33.562	0.000
MR-205	Limpieza de Pontones	und	33.562	0.000
MR-206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	ml	33.562	33.562
MR-300	CONTROL DE VEGETACIÓN			
MR-301	Roce y Limpieza	m2	33.562	2.920
MR-400	SEGURIDAD VIAL			
MR-401	Conservación de Señales	und	33.562	33.562
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL			
MR-601	Vigilancia y Control	km	33.562	2.920

Ing. Juan José Regalado Inga

RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

ING. RESIDENTE



Ramiro Kobi Coronel Camina
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N° 135617

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: Mantenimiento Periódico y RotaciónPropietario: Comuna Vecinal chunchuquillo Virgen del Camino - Tarma - ChontaliDirección: Jaen - CajamarcaContratista: Consorcio vial chontali

FECHA

ASIENTO N° 167 DEL INSPECTOR 30/06/2021

- Se constata la suspensión de los trabajos del día 29/06/2021 por ser feriado.
- Con presencia del Residente se realiza el recorrido del tramo en los cueros se intervino para validar los trabajos y/o metrados presentados por el residente del servicio, corroborándose los metros propuestos según cronograma.



RJ
 Ramiro Juli Coronel Camino
 INGENIERO INSPECTOR
 CIP. N° 135617



8. PUNTOS CRÍTICOS.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

- NO SE ENCUENTRAN PUNTOS CRÍTICOS EN EL TRAMO, DURANTE EL MES DE JUNIO (DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)




Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9. ANEXOS



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.1: Factura

9.2: Relación de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7: Copia de seguros del personal y vehículos utilizados para transporte de personal y herramientas.

9.8: Declaración Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

000067



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN**

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.1. FACTURA.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERÚ E.I.R.L Y CORPORACIÓN AVIR S.A.C. con RUC N° 20561152005; declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura correspondiente a la valorización N°04- JUNIO 2021, se presentara al momento de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador, el inspector y la entidad.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

JAÉN, 05 JULIO 2021

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL



9.2. RELACIÓN DE PERSONAL; ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN


CONSORCIO VIAL LA HUACA

Relación de personal técnico

Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	CARGO	DNI	Sexo
Juan José	Regalado	Inga	Ing. Residente	CIP. N 123648	M
Fernando	Jara	Díaz	Ing. Asistente	70900207	M
Consortio CC Ing. Ramiro Kobi	Coronel	Camino	Ing. Inspector	CIP. N° 135617	M

Relación de personal mano de obra no calificada (peones)

NOMBRES	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO	DNI	SEXO
Grahambell	ABAD	FLORES	JEFE DE CUADRILLA	48081362	M
Alex Heisten	ROJAS	OCHOA	OPERADOR	42813930	M
Nolver	QUINTANA	VASQUEZ	PEÓN	74652121	M
Hernesto Luzbel	PACHAMORA	ESTELA	PEÓN	71079886	M
Wilban	MORALES	VASQUEZ	PEÓN	74652133	M
Gilmer	BARTUREN	CORONEL	PEÓN	46883933	M
Eulis Kevin	MORALES	CHEVEZ	PEÓN	76757137	M


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648



9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTAL"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO-CHONTAL

SEMANA:

DÍA:

FECHA:

01-06-2021

OBRA:

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	48883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

DÍA: Miércoles FECHA: 02-06-2021

OBRA:

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883939	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES
(MONC)

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

DÍA: TuevesFECHA: 03-06-2021

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

 Ing. Juan José Repilado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:				D/A:	FECHA:	04 - 06 - 2021	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA		CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)					
OBRA:		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO-VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"					
CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI							
SEMANA:		D/A:	FECHA:				
		Sábado	05-05-2021				
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI "

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:		DÍA:	FECHA:	07-06-2021		
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA		CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)				
OBRA:		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"				
CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI						
SEMANA:		D/A:	FECHA:	08-06-2021		
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42819930	8:00AM - 12:00 M		
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		

Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONG)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:	DÍA:	FECHA:	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
MIÉRCOLES	09-06-2021					
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAMBELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46889933	8:00AM - 12:00 M		
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO-VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:		D/A:	Jueves		FECHA:	10-06-2021	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI "

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

OBRA:

SEMANA:

DÍA: **Viernes**

FECHA: **14-06-2021**

FIRMA DE SALIDA

HORA

FIRMA DE ENTRADA

HORA

DNI

CATEGORIA

APELLIDOS Y NOMBRES

ITEM

1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M			1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

CONSORCIO VIAL LA HUACA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO - CHONTALI

SEMANA:		DÍA:	Sábado	FECHA:	12-06-2021		
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	PRIMA DE ENTRADA	HORA	PRIMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M	<i>Geoff</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>Geoff</i>
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M	<i>Geoff</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>Geoff</i>
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M	<i>Geoff</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>Geoff</i>
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71075886	8:00AM - 12:00 M	<i>F. Pomeroy</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>F. Pomeroy</i>
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M	<i>Geoff</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>Geoff</i>
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M	<i>Geoff</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>Geoff</i>
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M	<i>Geoff</i>	1:00PM - 5:00 PM	<i>Geoff</i>


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO-VIRGEN DEL CARMEN-LA HUACA-CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

D/A:

FECHA:

14-06-2024

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

OBRA:

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883953	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

DÍA: Miércoles

FECHA:

16-06-21

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081383	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813990	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883533	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES
(MONC)

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

DÍA: Jueves

FECHA: 17-06-2021

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	PRIMA DE ENTRADA	HORA	PRIMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM/BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOIVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46889933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA		CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)					
OBRA:		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"					
CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI							
SEMANA:		D/A:	FECHA:	18-06-2021			
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652135	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES
(MONC)

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:

5 de mayo

DÍA:

19-06-2021

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	RUJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813950	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

OBRA:		DÍA:		FECHA:		21-06-2021	
SEMANA:		DÍA:		Lunes			
ITEM	APellidos y Nombres	CATEGORIA	DNI	HORA	PRIMA DE ENTRADA	HORA	PRIMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813580	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46833933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

SEMANA:		DIA:	FECHA:		HORA		PRIMA DE SALIDA	
			Martes		22-06-2021			
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FECHA DE ENTRADA	HORA	PRIMA DE SALIDA	
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48061363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813980	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079885	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
6	BARTUREN CORONEL GUIMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA		CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)					
OBRA:		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"					
SEMANA:		CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI					
DIA:		FECHA:					
DNI:		23-06-2021					
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOIVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA		CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)					
OBRA:		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"					
CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI							
SEMANA:		DÍA:	FECHA:	24-06-2021			
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAMIBELL	JEFE DE CUADRILLA	48081383	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA		CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONC)					
OBRA:		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"					
CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI							
SEMANA:		DÍA:	FECHA:				
		Vie	25-06-2021				
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	45883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES (MONG)

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTALI

OBRA:		SEMANA:		DÍA:	FECHA:	26-06-2021	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	PRIMA DE ENTRADA	HORA	HORA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42819930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652111	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILSAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46983933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES
(MONC)

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA- CHONTALI"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO - CHONTALI

SEMANA:		DÍA:	FECHA:	FIRMA DE ENTRADA		HORA	FIRMA DE SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA	
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
2	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
8	RUBIO ARNAO NAIMÉ	PEÓN	48336505	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
9	SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL	PEÓN	71079904	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
10	ROJAS OCHOA MARLO ELIAS	PEÓN	48169692	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
11	ROJAS ROJAS ANTONY ESMITH	PEÓN	77229295	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
12	MORALES CHAVEZ DEILER EDELI	PEÓN	76757136	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		
13		PEÓN		8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM		

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CONSORCIO VIAL LA HUACA

CONTROL DIARIO DE TRABAJADORES
(MONC)

OBRA:


MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-CHONTAL"

CONTROL DIARIO - CHUNCHUQUILLO -CHONTAL

SEMANA:

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	DNI	HORA	FIRMA DE ENTRADA	HORA	FIRMA DE SALIDA
1	ABAD FLORES GRAHAM BELL	JEFE DE CUADRILLA	48081363	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
2	ROJAS OCHOA ALEX HESTEN	OPERADOR	42813930	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
3	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	PEÓN	74652121	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
4	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	PEÓN	71079886	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
5	MORALES VASQUEZ WILBAN	PEÓN	74652133	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
6	BARTUREN CORONEL GILMER	PEÓN	46883933	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
7	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	PEÓN	76757137	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
8	RUBIO ARNAO NAIME	PEÓN	48336505	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
9	SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL	PEÓN	71079904	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
10	ROJAS OCHOA MARIO ELIAS	PEÓN	48169692	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
11	ROJAS ROJAS ANTONY ESMITH	PEÓN	77229295	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
12	MORALES CHAVEZ DEILER EDELI	PEÓN	76757136	8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	
13		PEÓN		8:00AM - 12:00 M		1:00PM - 5:00 PM	

Inge. Juan Jose Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

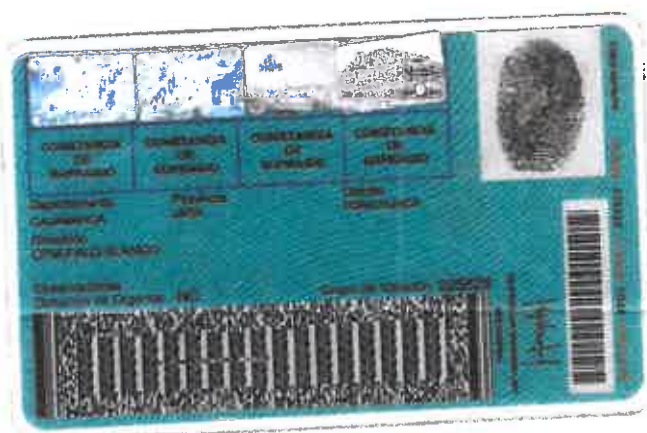



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648





Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648




Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

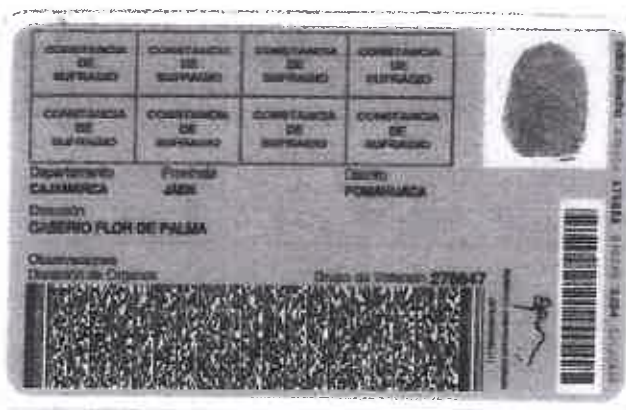


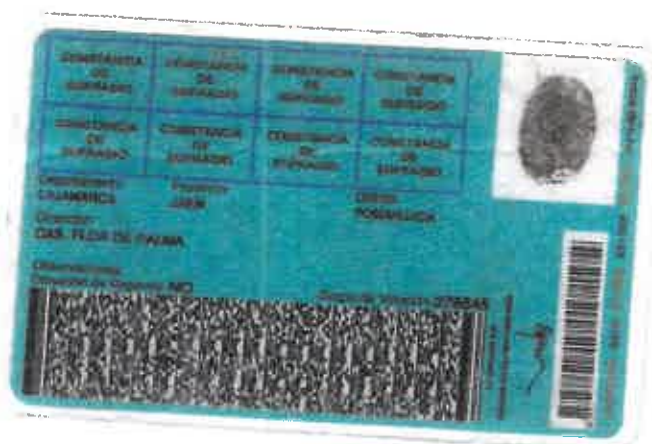


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648


[illegible]


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

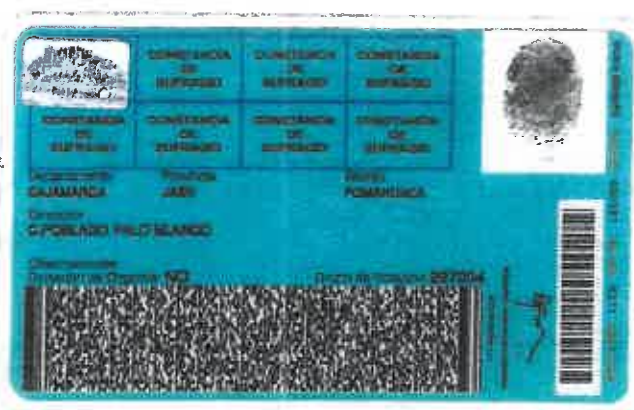





Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

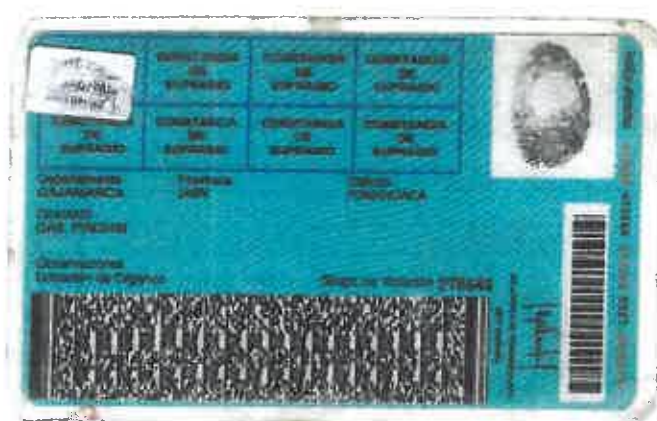




Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

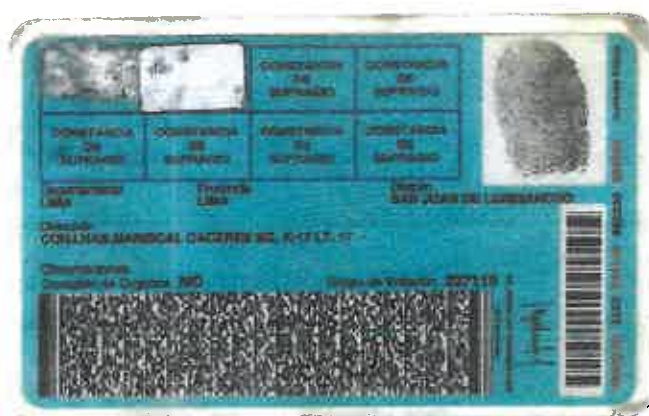




Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



[illegible]


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

"CONSORCIO VIAL LA HUACA "					PLANILLA N° 04 TAREO																											
OBRA :					MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"																											
PERÍODO					DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021																											
N° DE ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	RUC	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	TOTAL DIAS TRABAJADOS	
1	HUAMAN MARTINO SEGUNDO	PEÓN	45815273		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													12
2	MORI FERNANDEZ ANTONY	PEÓN	47490128				1	1	1	1	1			1	1	1	1															12
3	ZUTA MENDOZA JORGE JERSON	PEÓN	48269789				1	1	1	1	1			1	1	1	1															12
4	CIEZA TORRES MAO	PEÓN	41102413				1	1	1	1	1			1	1	1	1															12
5	ROJAS LOJA HERNAN DARIO	PEÓN	73712791				1	1	1	1	1			1	1	1	1															12
6	MENDOZA POQUIOMA ELMER	PEÓN	70314630				1	1	1	1	1			1	1	1	1															12


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

"CONSORCIO VIAL LA HUACA "				PLANILLA N° 05 TAREO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBRA :				MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PERÍODO				DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N° DE ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORÍA	DNI	RUC																													TOTAL DIAS TRABAJADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S		D	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	HUAMAN MARTINO SEGUNDO	PEÓN	45815273		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648

"CONSORCIO VIAL LA HUACA "											PLANILLA N° 04- 05 MANIFIESTO DE GASTOS - PAGO (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)										
OBRA:											MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL " CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"										
PERÍODO											FECHA										
											DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021										
N° de Orden	Apellidos y Nombres			Categoría	Documento de Identidad	GENERO		días laborados	Jornal (\$/.)	Total a Pagar (\$/.)	DESCUENTO POR PENSIÓN	TOTAL A PAGAR (\$/.)	FIRMA								
						M	F														
1	HUAMAN MARTINO SEGUNDO			PEÓN	45815273	X		24	50	S/1,200.00	S/0.00	S/1,200.00									
2	MORI FERNANDEZ ANTONY			PEÓN	47490128	X		24	50	S/1,200.00	S/0.00	S/1,200.00									
3	ZUTA MENDOZA JORGE JERSON			PEÓN	48269789	X		24	50	S/1,200.00	S/0.00	S/1,200.00									
4	CIEZA TORRES MAO			PEÓN	41102413	X		24	50	S/1,200.00	S/0.00	S/1,200.00									
5	ROJAS LOJA HERNAN DARIO			PEÓN	73712791	X		24	50	S/1,200.00	S/0.00	S/1,200.00									
6	MENDOZA POQUIOMA ELMER			PEÓN	70314630	X		24	50	S/1,200.00	S/0.00	S/1,200.00									
				TOTAL						S/ 7,200.00	S/ 0.00	S/ 7,200.00									


 Ing. Juan José Regalado Inga
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.


Ing. Juan José Regalado
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MP/JCS-1
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
ROUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI - 34.30 KM"

000021



ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ROUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
CONTRATO DE SERVICIO	:	CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MP/JA
FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	25/08/2020
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 2,923,653.45 (Con IGV) S/ 2,477,672.42 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO	:	S/ 2,338,000.00 (Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DÍAS CALENDARIO FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO) FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIÓDICO) FASE 3: 1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO ROUTINARIO) 2. 5 D.C. (INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL)
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL	:	Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR	:	Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del día 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutará el servicio de: **EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ROUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM**, por parte de la entidad contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, el Asistente Técnico de Gestión y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Pública Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing. Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, su representante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N° 43419729; con la finalidad de llevar a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedió a verificar el terreno donde se ejecutará el servicio de mantenimiento periódico y rutinario, iniciando el recorrido en el centro poblado Chunchuquillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca, concluyendo en la localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verificó el estado de la vía, verificando que esta reúne las condiciones para la realización del mantenimiento periódico y rutinario, materia del CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MP/JA, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuación la presente ACTA en SEIS (06) ejemplares en señal de conformidad con el acto realizado.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN:



Ing. EULER BECERRA AREVALO
DNI N° 41548698
COORDINADOR MPJ

Ing. Segundo Luis Ortiz Barboza
INSPECTOR DE OBRA

Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA
DNI N° 44487673
INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA:

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. REYLE CIEZA TORRES
DNI N° 43419729
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

000020

CONSORCIO VIAL LA HUACA

**9.6. COPIA DEL CONTRATO Y
CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA.**

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MP/JCS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM"



000019

Indice
T: 2256

CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MP/JA.

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM"

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martín Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Región Cajamarca, representada por su **ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA**, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolución de Alcaldía N° 0348-2019-MP/JA de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al **GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA**, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simón Bolívar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte **EL CONSORCIO VIAL LA HUACA**, con domicilio legal en Jr. Santa Lucía N° 256 - Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Común el **Sr. REYLE CIEZA TORRES**, con DNI N° 43419729, **EL CONSORCIO VIAL LA HUACA** está conformado por la empresa **INTED PERU E.I.R.L.** con RUC: 20561152005 con domicilio legal en el Jr. Santa Lucía N° 256 - Chachapoyas - Amazonas, inscrita en la Partida Electrónica N° 11025027 Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente el **Sr. REYLE CIEZA TORRES** con DNI: 43419729, con una participación del 60% en el presente Consorcio y la empresa **CORPORACION AVIR S.A.C.** con RUC: 20487592545, con domicilio legal en el Jr. Trunfo N° 1374 - Chachapoyas - Amazonas, inscrita en la Partida Electrónica N° 11020454 Asiento N° C00002, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente el **Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO** con DNI: 42198006, con una participación del 40% en el presente Consorcio; La facturación del Consorcio será a través de la empresa **INTED PERU E.I.R.L.** en el CCI N° 011-081-000100007888-79, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MP/JCS-1** para la contratación del servicio para la **EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM**, al **CONSORCIO VIAL LA HUACA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio para la **EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM**, al **CONSORCIO VIAL LA HUACA**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2,338,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES**, que incluye todos los impuestos de Ley (**NO INCLUYE EL IGV**).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
DOCUMENTO AUTENTICADO

JAÉN 15 FEB 2021



Tomás Cubas Guevara
FEDATARIO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 001-2020-MPJ/CS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL: CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA – CHONTALI – 34.30 KM"



000018

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en **PAGO ÚNICO** para la FASE I; **PAGOS MENSUALES PARA LA FASE II y III (con excepción del pago por el inventario de Condición Vial, que será en pago Único)**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. según el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de veinte (20) días de producida la recepción.

Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del área usuaria:

DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN	CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA	PAGOS PARCIALES
FASE I: Entrega del Plan de Trabajo.	Aprobación del Plan de Trabajo	1% del Monto del Contrato Original
FASE II: Entrega de Informes Mensuales e Informe Final del servicio de mantenimiento periódico.	Conformidad de los informes mensuales e informe Final de la ejecución del Mantenimiento Periódico.	Se paga mensualmente de acuerdo al avance mensual ejecutado, teniendo como límite el 83% del monto del contrato original.
FASE III: - Entrega de Informes Mensuales del servicio de mantenimiento rutinario. - Inventario de condición vial.	Conformidad de los informes mensuales del Mantenimiento Rutinario.	Se paga mensualmente por mantenimiento rutinario. La suma de dichos pagos representa el 15% del monto del Contrato original
	Aprobación del Inventario de Condición Vial.	1% del Monto del Contrato Original
TOTAL		100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **475 (cuatrocientos setenta y cinco)** días calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboración del Plan de Trabajo será de 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecución del mantenimiento periódico será de 90 (Noventa) días calendario.

El inicio del plazo de ejecución de la Fase II se realizará al día siguiente de la comunicación de la aprobación del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecución del mantenimiento rutinario será de 360 días calendario. Desde el 01 de enero del 2021

El plazo de la elaboración del inventario de condición vial será de 05 días calendario.

El inicio del plazo de ejecución de cada actividad de la Fase III se realizará de la siguiente manera:



CONSORCIO VIAL LA HUACA
Ing. Rayo Cieza Torres
RESPONSABLE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MP/JCS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM"



000017

-La ejecución del mantenimiento rutinario, al día siguiente de suscrita el acta de terminación de las actividades de la Fase II.

-La elaboración del Inventario de Condición Vial, al día siguiente de suscrita el acta de terminación de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento especial de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, a través de la retención del 10% solicitado mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la Primera Mitad del número total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) días calendarios siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 y la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Rayle Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 001-2020-MP/JCS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA – CHONTALI – 34.30 KM"



000016

penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.



El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecución del mantenimiento periódico:

CAUSALES	PENALIDAD (FORMA DE CÁLCULO)	PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido	Se aplicará 0.5 de una UIT por cada día de ausencia del personal	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada día de demora	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades	Se aplicará 2 UIT por el incumplimiento	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento de uso de implementos de seguridad (mameluco, casco, botas, guantes, gafas y mascarillas)	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada personal que incumpla el uso de implementos de seguridad	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
En caso no cuenten con los seguros (SCTR y SOAT)	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada personal sin seguros, o vehículos sin SOAT	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Ausencia del Ing. Residente del servicio	Se aplicará 0.50 de una UIT por cada día de ausencia	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Roldán Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN**

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MPJ/CS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA – CHONTALI – 34.30 KM"



000015

No disponer del número mínimo de las maquinarias y equipos establecidos	Se aplicará una (1) UIT por cada día de ausencia de número mínimo de equipos y maquinarias	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No zarandear el material de afirmado en cantera	Se aplicará dos (2) UIT por cada evento que se detecte	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No presentar en los informes fotos y videos de cada día fechados y georreferenciados	Se aplicará 0.50 de una UIT por cada informe	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector

Durante la ejecución del mantenimiento rutinario:

ACTIVIDADES	UNIDAD	TOLERANCIA	PENALIDAD (FORMA DE CÁLCULO)	PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza de calzada	Km	Menos de 3 obstáculos en 1 km.	Cuando la cantidad de obstáculos supera la tolerancia se aplicará 0.25 de la UIT por cada Km observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Bacheo	m2	Menos de 10 baches de 0.50m x 0.50 x 0.15m en 1 km.	Cuando la cantidad de baches supera la tolerancia se aplicará 0.5 de la UIT por cada Km observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Desquinche	m3	1 m3 por km	Cuando la cantidad de m3 supera la tolerancia se aplicará 0.25 de una UIT por cada Km observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Remoción de derrumbes	m3	1 m3 por km	Cuando la cantidad de m3 supera la tolerancia se aplicará 0.5 UIT por cada Km observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Limpieza de cunetas	M	Máximo 25% del área de la sección transversal	Cuando el porcentaje supera la tolerancia se aplicará 1 UIT	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Limpieza de alcantarillas	Und	Máximo 20% del área de la sección transversal.	Cuando el porcentaje supera la tolerancia se aplicará 0.5 de la UIT por cada alcantarilla observada	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Limpieza de badén	m2	Máximo 30% de la superficie.	Cuando el porcentaje supera la tolerancia se aplicará 0.5 de la UIT por cada badén observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Limpieza de zanja coronación	M	Máximo 30% de la sección transversal.	Cuando el porcentaje supera la tolerancia se aplicará 0.25 UIT	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Limpieza de pontones	Und	Deberá permanecer siempre limpia	En caso de no cumplir la tolerancia se aplicará 0.25 UIT por cada pontón observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Encauzamiento de pequeños cursos de agua	M	Máximo 20% del área de la sección transversal.	Cuando el porcentaje supera la tolerancia se aplicará una 0.5 UIT por cada curso de agua observado.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Roce y limpieza	m2	Máximo 45 cm.	Cuando supera el valor de la tolerancia se aplicará 0.25 UIT	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Conservación de las señales	und	Incumplimiento inferior a 1 señal por km.	Cuando supera la cantidad de la tolerancia se aplicará 0.25 de la UIT por cada señal observada.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Reforestación	und	Zonas estables sin reforestar a lo largo del camino	Cuando no se haya reforestado zonas inestables conforme al cronograma se aplicará 0.25 de la UIT por cada zona inestable sin reforestar.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Vigilancia y control	km	Incumplimiento no mayor a 15 días.	Cuando supera la cantidad días de la tolerancia se aplicará 0.25 de la UIT por cada día observada.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.



Ina. Róly Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
DOCUMENTO AUTÉNTICO
JAÉN 15 FEB 2021
Tomás Cubas Guevara
FEDATARIO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 001-2020-MPJ/CS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM"



000014

Reparación de muros secos	m3	Menos de 5 m de muro en mal estado en un (1) km de carretera	En caso de no cumplir la tolerancia se aplicará 0.25 de la UIT por cada muro observado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Reparación de pontones	und	Pontones en buen estado	En caso de no cumplir la tolerancia se aplicará 0.5 UIT por cada pontón no reparado	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.

CAUSALES	PENALIDAD (FORMA DE CÁLCULO)	PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido	Se aplicará 0.5 de una UIT por cada día de ausencia del personal	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada día de demora	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades	Se aplicará 1 UIT por el incumplimiento	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento de uso de implementos de seguridad (mameluco, casco, botas, guantes, gafas y mascarillas)	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada personal que incumpla el uso de implementos de seguridad	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
En caso no se implementen los seguros (SCTR y SOAT)	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada personal sin seguros, o vehículos sin SOAT	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Ausencia del Ing. Residente del servicio	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada día de ausencia.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No usar material seleccionado de cantera para el Bacheo	Se aplicará 0.5 de una UIT por cada evento que se detecte.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
No presentar en los informes fotos y videos de cada día fechados y georreferenciados	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
No utilizar movilidad adecuada para transporte de personal (trabajadores) y herramientas	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada evento que se detecte.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 001-2020-MPJ/CS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO – VIRGEN DEL CARMEN – LA HUACA – CHONTALI – 34.30 KM"



000013

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA", para la ejecución del servicio utilizará personal calificado y especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, "EL CONTRATISTA" deberá proponer a "LA ENTIDAD" con Quince (15) días antes de que se culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo que LA ENTIDAD deberá aprobar dentro los Ocho (8) días siguientes, conforme al Art. 190° numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, será debidamente justificado y los cambios que resulten no irroguen gastos adicionales a "LA ENTIDAD".



CONSORCIO VIA LA HUACA

Ing. Raylla Cieza Torres
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MPJ/CS-1 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM"



000012

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA", designa como:

N°	CARGO	NOMBRE	CIP N°
01	Residente del servicio	Ing. RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ	N° 82457
02	Asistente de Residente	Ing. ALAN FLORENTINO MENDOZA MUÑOZ	N° 175686

"EL CONTRATISTA", dará por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD".

"EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondrá a "LA ENTIDAD", el cambio respectivo a fin de obtener la aprobación del mismo, transcurrido los quince (15) días calendarios y en caso "LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtención de reemplazos necesarios, tales como: Pasajes, viáticos, gastos de traslado, entre otros; será de entera responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martín Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Región Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucía N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 días del mes de agosto de 2020.

"LA ENTIDAD"



CONSORCIO VIAL LA HUACA

Ing. Reyle Liza Torres
REPRESENTANTE LEGAL
"EL CONTRATISTA"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAÉN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

**9.7. COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHÍCULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.**

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

Pacífico Salud EPS**Pacífico Vida**

San Isidro, 01 de Junio del 2021

CONSTANCIA N° 3652817

Señores
INTED PERU EIRL
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021 correspondiente a:

CONTRATO N° **102423** en SALUD y,
POLIZA N° **62075441** en PENSION


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ABAD FLORES GRAHAM BELL	48081363	01 de Junio del 2021
000002	BARTUREN CORONEL GILMER	46883933	01 de Junio del 2021
000003	CIEZA TORRES MAO	41102113	01 de Junio del 2021
000004	FERNANDEZ CORREA JONATHAN SMITH	74374339	01 de Junio del 2021
000005	HUAMAN MARTINO SEGUNDO	45815273	01 de Junio del 2021
000006	MORALES CHAVEZ EULIS KEVIN	76757137	01 de Junio del 2021
000007	MORALES VASQUEZ WILBAN	74652133	01 de Junio del 2021
000008	MORI FERNANDEZ ANTHONY	47490128	01 de Junio del 2021
000009	PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL	71079886	01 de Junio del 2021
000010	PECHE MELO EDWIN IVAN	45715900	01 de Junio del 2021
000011	QUINDE SAAVEDRA JAVIER ANGEL	44386160	01 de Junio del 2021
000012	QUINTANA VASQUEZ NOLVER	74652121	01 de Junio del 2021
000013	ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN	42813930	01 de Junio del 2021
000014	ZUTA MENDOZA JORGE JERSON	48269789	01 de Junio del 2021

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,


Ing. Juan José Reguiado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

Pacífico Salud EPS**Pacífico Vida**


JORGE GOMEZ MILLA
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD

FACTURA **N F02800463384**

LIQUIDACION **N 9229435**



ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA



Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

Av Juan De Arona Nro 830 San Isidro, Lima, Lima, Peru

R.U.C.: 20431115825

FACTURA ELECTRÓNICA

F028-00463384

Cliente: INTED PERU EIRL
Dirección: JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR
LIB
Localidad: CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -
R.U.C. 20561152005
Fecha de Emisión: 01/06/2021
Asegurado: INTED PERU EIRL
Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONIO (0304774)

Moneda: SOL
N° Relación:
Prima: 134.64
Producto: SCTR
Documento: R-2970500
Póliza/Contrato: 102423
Vigencia: 01/06/2021 - 30/06/2021

A/COS	Giro	V. Venta
8292523	C-3378006	158.88
Op. Gratuitas		0.00
Op. Exoneradas		0.00
Op. Inafectas		0.00
Op. Gravadas		134.64
Intereses / Otros cargos		0.00
Total Descuento		0.00
IGV		24.24
Importe Total		158.88

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 SOLES



Autorizado mediante resolución N°
0180050001200/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica
Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



POLIZA N° 62075441

Vigencia : 01/06/2021 al 01/07/2021

LIQUIDACION DE PRIMA N° 9229435

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante : INTED PERU EIRL 2208854

Asegurado : INTED PERU EIRL

Dirección : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD)
CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Plan : ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIONES)

Agente : SIN INTERMEDIACION.

Código : 300500

Reg. Prod. :

Moneda : SOLES

Periodo en meses : 1

Inicio : 01/08/2020

Central de emisión : OF. PRINCIPAL

Forma Pago : CONTADO

Fecha Emisión : 01/06/2021

Fecha Vencimiento : 15/07/2021

TOTAL REMUNERACIONES

19,800.00

PRIMA COMERCIAL

138.68

INTERESES Y PENALIDADES

0.00

IMPSTO.GRAL. A VENTAS

24.96

TOTAL A COBRAR

S/ 163.64

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¿Cómo realizar el pago?

Podrá pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:

- Ingresar a la opción Pago de servicios/Pacifico Seguros
- Seleccionar el producto a pagar según el banco que corresponda:
 - BCP: Vida Soles o Dólares
 - CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
 - SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Dólares
 - INTERBANK: Vida MN o ME

- Ingresar el número de póliza
- Seleccionar la cuota a pagar
- Confirmar el pago

Lima, 1 Junio del 2021

ADMISCTRSALUD1

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



POLIZA N° 62075441

Vigencia : 01/06/2021 al 01/07/2021

LIQUIDACION DE PRIMA N° 9229435

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante : INTED PERU EIRL 2208854

Asegurado : INTED PERU EIRL

Dirección : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD)
CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Plan : ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIONES)

Agente : SIN INTERMEDIACION.

Código : 300500

Reg. Prod. :

Moneda : SOLES

Periodo en meses : 1

Inicio : 01/08/2020

Central de emisión : OF. PRINCIPAL

Forma Pago : CONTADO

Fecha Emisión : 01/06/2021

Fecha Vencimiento : 15/07/2021

TOTAL REMUNERACIONES

19,800.00

PRIMA COMERCIAL

138.68

INTERESES Y PENALIDADES

0.00

IMPSTO.GRAL. A VENTAS

24.96

TOTAL A COBRAR

S/ 163.64

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¿Cómo realizar el pago?

Podrá pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:

- Ingresar a la opción Pago de servicios/Pacifico Seguros
- Seleccionar el producto a pagar según el banco que corresponda:
 - BCP: Vida Soles o Dólares
 - CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
 - SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Dólares
 - INTERBANK: Vida MN o ME

- Ingresar el número de póliza
- Seleccionar la cuota a pagar
- Confirmar el pago

Lima, 1 Junio del 2021

ADMISCTRSALUD1

000007



San Isidro, 01 de Junio del 2021

CONSTANCIA N° 00184005

Señores:

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: **SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE ANUALMENTE**

Estimados Señores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados bajo las coberturas correspondientes a la póliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021.


No.	Apellidos y Nombres	Documento	Inicio Cobertura
1.00	CIEZA TORRES REYLE	43419729	01/06/2021
2.00	HUAMAN MARTINO SEGUNDO	45815273	01/06/2021
3.00	YOMONA TRUJILLO NANCY	47668117	01/06/2021

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,


ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE

Liquidación de prima: 9229425


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

**POLIZA N° 74882**

Vigencia : 01/06/2021 al 01/07/2021

LIQUIDACION DE PRIMA N° 9229425

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante	: INTED PERU EIRL	2208854
Asegurado	: INTED PERU EIRL	
Dirección	: JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS	
Plan	: VIDA LEY EMPLEADOS (D.L.688)	
Agente	: FACHO FLORES GERVE ANTONIO	
	Código : 11903	Reg. Prod. : N3811
Moneda	: SOLES	Periodo en meses : 1
Inicio	: 01/08/2020	Central de emisión : OF. PRINCIPAL
Forma Pago	: CONTADO	Fecha Emisión : 01/06/2021
		Fecha Vencimiento : 30/06/2021
TOTAL REMUNERACIONES : 7,130.00		
PRIMA COMERCIAL : 29.67		
INTERESES Y PENALIDADES : 0.00		
IMPSTO.GRAL. A VENTAS : 5.34		
TOTAL A COBRAR : S/. 35.01		

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¿Cómo realizar el pago?

- Podrá pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:
 - Ingresar a la opción Pago de servicios/Pacifico Seguros
 - Seleccionar el producto a pagar según el banco que corresponda:
 - BCP: Vida Soles o Dólares
 - CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
 - SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Dólares
 - INTERBANK: Vida MN o ME
 - Ingresar el número de póliza
 - Seleccionar la cuota a pagar
 - Confirmar el pago

Lima, 1 Junio del 2,021

ADMVGWEB1

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

**POLIZA N° 74882**

Vigencia : 01/06/2021 al 01/07/2021

LIQUIDACION DE PRIMA N° 9229425

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante	: INTED PERU EIRL	2208854
Asegurado	: INTED PERU EIRL	
Dirección	: JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS	
Plan	: VIDA LEY EMPLEADOS (D.L.688)	
Agente	: FACHO FLORES GERVE ANTONIO	
	Código : 11903	Reg. Prod. : N3811
Moneda	: SOLES	Periodo en meses : 1
Inicio	: 01/08/2020	Central de emisión : OF. PRINCIPAL
Forma Pago	: CONTADO	Fecha Emisión : 01/06/2021
		Fecha Vencimiento : 30/06/2021
TOTAL REMUNERACIONES : 7,130.00		
PRIMA COMERCIAL : 29.67		
INTERESES Y PENALIDADES : 0.00		
IMPSTO.GRAL. A VENTAS : 5.34		
TOTAL A COBRAR : S/. 35.01		

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¿Cómo realizar el pago?

- Podrá pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:
 - Ingresar a la opción Pago de servicios/Pacifico Seguros
 - Seleccionar el producto a pagar según el banco que corresponda:
 - BCP: Vida Soles o Dólares
 - CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
 - SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Dólares
 - INTERBANK: Vida MN o ME
 - Ingresar el número de póliza
 - Seleccionar la cuota a pagar
 - Confirmar el pago

Lima, 1 Junio del 2,021

ADMVGWEB1

000005

000003



Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT
DIGITAL

COMPañIA DE SEGUROS

EN CASO DE EMERGENCIAS



411 1111

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

N° Póliza - Certificado

000005605225000000000001

Desde

29/12/2020

Hasta

29/12/2021

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

Desde

29/12/2020

Hasta

29/12/2021

Vigencia
de uso
exclusivo
para el
control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa

T9C821

CONTRATANTE / ASEGURADO

INTED PERU EIRL

Categoría / Clase

CAMIONETA PICK UP 4X4

Importe de la prima

S/. 160

Uso

CARGA/TRANSPORTE

Fecha

12/11/2020

Vini / N° de serie

8AFAR23L2JJ043237

Hora de emisión

12:40:30

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

La información sobre las obligaciones y derechos del contratante/asegurado, coberturas y exclusiones, las podrás encontrar ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla informativa en las oficinas de tu compañía de seguros.



9.8. DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.


Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén y Departamento de Cajamarca que al final suscribe.

CERTIFICA:

Que la empresa "CONSORCIO VIAL LA HUACA" viene realizando los trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, desde el 19 de marzo 2021 al 30 de Junio del 2021 (3 meses y 13 días), representado por el ING. ING. REYLE CIEZA TORRES, de dicho Contratista no se ha recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadores en el servicio, deudas pendientes a miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningún concepto, por lo que se Certifica que el contratista **NO TIENE DEUDA** alguna en la zona de la influencia y alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

PALO BLANCO 01 JULIO DEL 2021



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Reyle Cieza Torres', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'JUEZ DE PAZ' and 'PALO BLANCO - POMAHUACA'.
